



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟผ.๓

ถึง ผบภ.๒

เลขที่ ฉ.๓ กกค.(จร.)

วันที่

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ คชฟ.๓ (สถานะ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)

เรียน อผ.บภ.๒

ตามที่ กฟผ.๓ ได้รับจัดสรรปริมาณงานก่อสร้างและงบประมาณตามโครงการ คชฟ.๓ ให้ดำเนินการ จำนวน ๔๐๒ วงจร-กม.(ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕) เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กฟผ.๓ นั้น

กฟผ.๓ ได้จัดทำข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ คชฟ.๓ พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ (เอกสารแนบ จำนวน ๔ แผ่น)

- ๑.อนุมัติหลักการ จำนวน ๔๐๔ งาน ปริมาณงาน ๕๖๐.๖๒ วงจร-กม.
- ๒.งานก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO+CLSD)จำนวน ๓๘๙ งาน ปริมาณงาน ๔๘๙.๙๕ วงจร-กม.
- ๓.งานอยู่ระหว่างก่อสร้าง(REL) จำนวน ๑๓ งาน ปริมาณงาน ๖๙.๘๔ วงจร-กม.
- ๔.รอดำเนินการ(CRTD) จำนวน ๒ งาน ปริมาณงาน ๐.๘๔ วงจร-กม.
- ๕.ปิดงานก่อสร้างแล้ว(CLSD) จำนวน ๓๘๕ งาน ปริมาณงาน ๔๘๔.๑๗ วงจร-กม.
- ๖.รอปิดงานก่อสร้าง(TECO) จำนวน ๔ งาน ปริมาณงาน ๕.๗๗ วงจร-กม.
- ๗.ผลงานสะสมทั้งโครงการ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๔๘๙.๙๕ วงจร-กม.

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ [http://intranet.pea.co.th/รับส่งข้อมูล กฟผ.๓/ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ/กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย \(จร.\)](http://intranet.pea.co.th/รับส่งข้อมูล กฟผ.๓/ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ/กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย (จร.)) /สรุปสถานะโครงการ คชฟ.๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สุริยะ จีระวาส

(นายสุริยะ จีระวาส)

รฟ.วบ.ฉ.๓ รักษาการแทน อช.ฉ.๓

- 8 มี.ค. 2562

ที่ ฉ.๓ กกค.(จร.) ๗๕/๒๕๖๒ - ๘ มี.ค. ๒๕๖๒

เรียน อผ.บภ.ฉ.๓(อก.ปป.), อผ.วบ.ฉ.๓(อก.ว. , อก.กค.), ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓
- เพื่อโปรดทราบ และเร่งรัดส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

(นายสุริยะ จีระวาส)

รฟ.วบ.ฉ.๓ รักษาการแทน อช.ฉ.๓

แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เบอร์โทร. (๒๗)๑๐๑๖๗

สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ คชฟ.3 ในเขต กฟผ.3

เดือน ธ.ค.2561

ที่	กฟผ.จุฬารามงาน	อนุมัติ (1)		ค่าใช้จ่าย หน่วยงานที่อนุมัติ	ค่าใช้จ่าย หน่วยงานที่เบิก	เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่าย	ก่อสร้างแล้วเสร็จ (2)		ปิดงาน กส.แล้ว (5)		รอปิดงาน (6)		เปอร์เซ็นต์ การปิดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง (3)		รอลำเนินการ (4)	
		งาน	วงจร-กม.		บาท		งาน	วงจร-กม.(7)	งาน	วงจร-กม.	งาน	วงจร-กม.		งาน	วงจร-กม.	งาน	วงจร-กม.
1	นครราชสีมา	95	54.05	17,412,474.00	8,212,443	47.16%	87	44.71	83	38.94	4	5.77	91.58%	6	8.50	* 2	0.84
2	นครราชสีมา2 (ททล.)	26	18.50	6,529,493.00	2,764,737	42.34%	26	18.50	26	18.50	-	-	100.00%	-	-	-	-
3	นครราชสีมา3 (สรน.)	17	35.73	11,995,119.00	11,859,806	98.87%	17	35.73	17	35.73	-	-	100.00%	-	-	-	-
4	สีกะ	21	81.29	28,034,710.39	26,448,110	94.34%	19	55.67	19	55.67	-	-	90.48%	2	25.62	-	-
5	ปากช่อง	23	66.57	16,112,424.00	10,547,976	65.46%	22	48.87	22	48.87	-	-	95.65%	1	17.70	-	-
6	โชคชัย	28	28.12	7,308,308.00	5,114,298	69.98%	27	22.30	27	22.30	-	-	96.43%	1	5.82	-	-
7	บัวใหญ่	15	12.81	3,145,884.00	2,153,548	68.46%	15	12.81	15	12.81	-	-	100.00%	-	-	-	-
8	พิมาย	16	22.76	8,294,573.00	5,198,217	62.67%	16	22.76	16	22.76	-	-	100.00%	-	-	-	-
9	ปักธงชัย	10	28.23	11,868,959.00	6,619,970	55.78%	10	28.23	10	28.23	-	-	100.00%	-	-	-	-
10	บุรีรัมย์	56	51.37	18,680,874.82	13,276,768	71.07%	54	42.67	54	42.67	-	-	96.43%	2	8.70	-	-
11	นางรอง	30	72.51	20,167,241.00	11,147,749	55.28%	30	72.51	30	72.51	-	-	100.00%	-	-	-	-
12	สุรินทร์	12	12.09	2,089,010.00	1,218,200	58.31%	12	12.09	12	12.09	-	-	100.00%	-	-	-	-
13	ปราสาท	8	15.00	4,838,774.00	3,164,950	65.41%	7	11.50	7	11.50	-	-	87.50%	1	3.50	-	-
14	ชัยภูมิ	44	60.51	15,673,285.00	12,435,140	79.34%	44	60.51	44	60.51	-	-	100.00%	-	-	-	-
15	ภูเขียว	3	1.10	689,890.00	445,765	64.61%	3	1.10	3	1.10	-	-	100.00%	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		404	560.62	172,841,019.21	120,607,677	69.78%	389	489.95	385	484.17	4	5.77	96.29%	13	69.84	2	0.84


หมายเหตุ - กฟผ.สีกะ หักค่าใช้จ่ายหน้างานการจ้างก่อสร้าง สฟ.สีกะ จำนวน 76,211,159.72 บาท เรียบร้อยแล้ว
 - กฟผ.บุรีรัมย์ หักค่าใช้จ่ายหน้างานรวมการจ้างก่อสร้าง สฟ.บุรีรัมย์ จำนวน 75,178,780.87 บาท เรียบร้อยแล้ว
 - งานสถานะ CRTD รอลำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 งาน และ รอยกเลิก 1 งาน*

แผนและผลการก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการ คชฟ.3 ปี 2561

วงจร-กม.

ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2562)

เดือน ธ.ค.2561

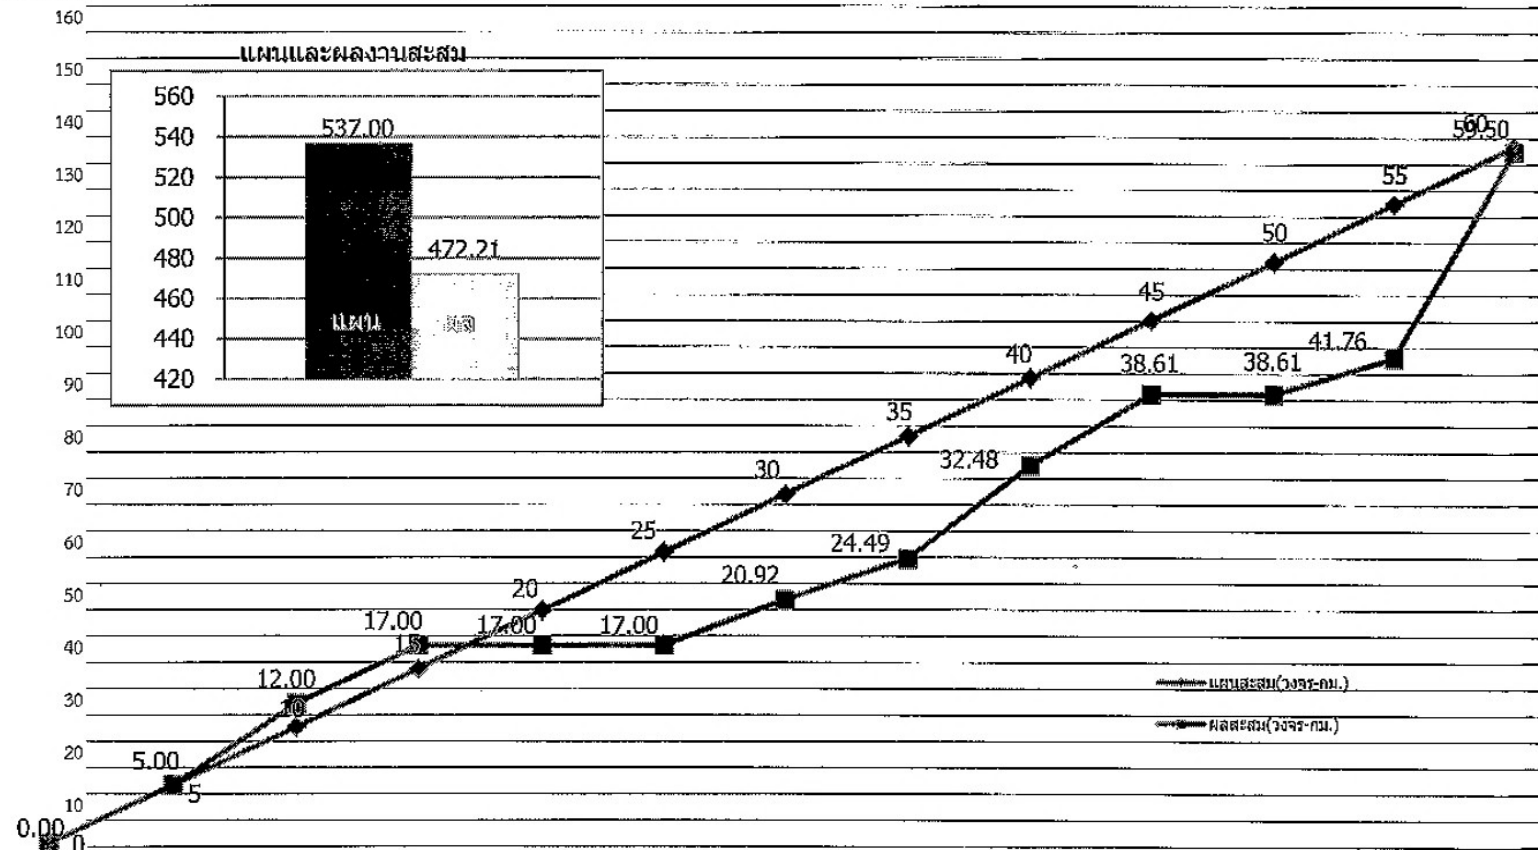


รายการ	ช่วงเวลา	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
แผน(วงจร-กม.)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
แผนสะสม(วงจร-กม.)		5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00
ผล(วงจร-กม.)		5.00	7.00	5.00	0.00	0.00	3.92	3.58	7.98	6.13	0.00	3.15	17.74
ผลสะสม(วงจร-กม.)		5.00	12.00	17.00	17.00	17.00	20.92	24.50	32.48	38.61	38.61	41.76	59.50
แผนสะสมทั้งโครงการ		487.00	492.00	497.00	502.00	507.00	512.00	517.00	522.00	527.00	532.00	537.00	542.00
ผลสะสมทั้งโครงการ		435.45	442.45	447.45	447.45	447.45	451.37	454.95	462.93	469.06	469.06	472.21	489.95

แผนและผลการก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการ คขฟ.3 ปี 2561

ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2562)

เดือน ธ.ค. 2561

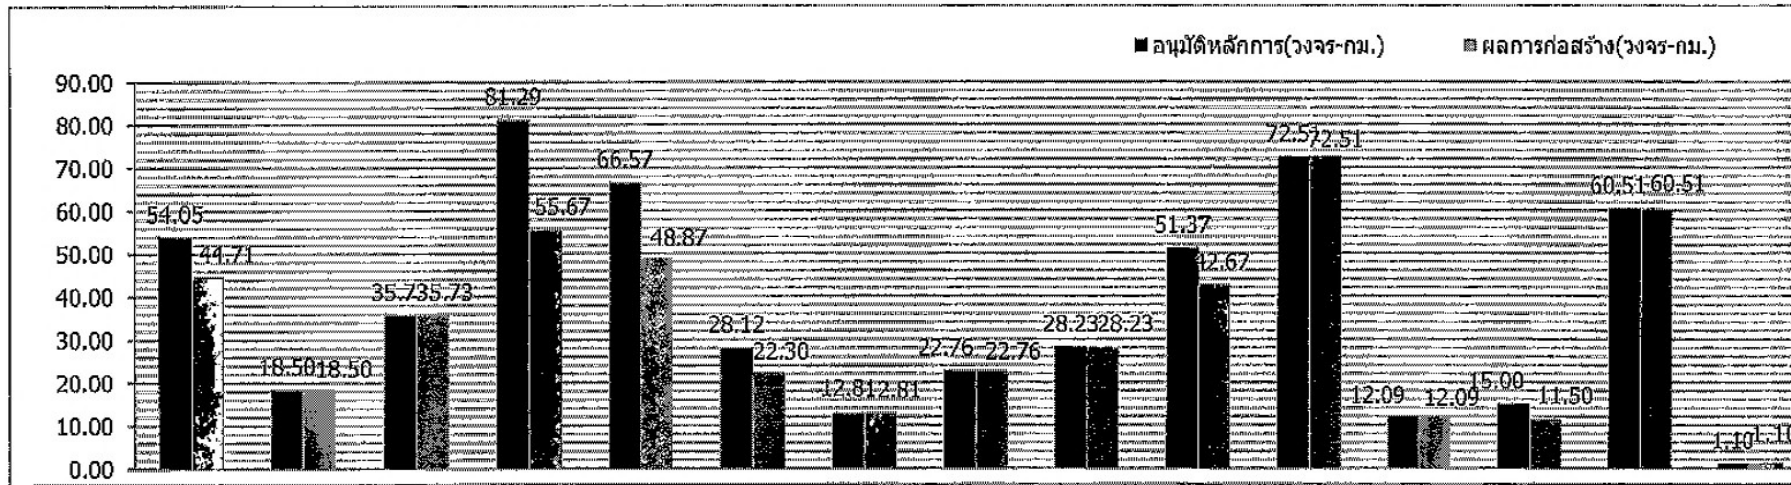

กฟฟ.	นม.	ททล.	สรน.	สคว.	ปง.	ช.	บุญ.	พม.	ป.	บ.	น.	ส.	ป.	ข.	ภ.	รวม
(ทำงานยกเลิก)(วงจรร-กม.)	54.05	18.50	35.73	81.29	66.57	28.12	12.81	22.76	28.23	51.37	72.51	12.09	15.00	60.51	1.10	560.62
ก่อสร้าง(วงจรร-กม.)	44.71	18.50	35.73	55.67	48.87	22.30	12.81	22.76	28.23	42.67	72.51	12.09	11.50	60.51	1.10	489.95
สิ้นสุดการก่อสร้าง	82.73%	100.00%	100.00%	68.48%	73.41%	79.29%	100.00%	100.00%	100.00%	83.06%	100.00%	100.00%	76.67%	100.00%	100.00%	87.39%

สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ คขฟ.3 ในเขต กฟฟ.3 เป็นวงจรร-กม.

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตาม คพฟ.3 ในส่วนที่ กพฉ.3 ได้รับการจัดสรร
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561

รายละเอียด	งบประมาณ (ล้านบาท)				ปริมาณงาน (วงจรร-กม.)					
	ได้รับจัดสรร ปี 54-59	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ทั้งโครงการ	ได้รับจัดสรรปี 54-60					
					แผนงาน	สำรวจออกแบบ		การก่อสร้าง		
						สำรวจ ออกแบบแล้ว	อยู่ระหว่าง ออกแบบ	ก่อสร้างแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
ค่าประสานงานโครงการ และค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง	6.136	6.136	0	402	560.62	560.62	-	482.95	76.83	0.84
ค่าริเริ่มโครงการ และค่าสำรวจออกแบบ (P-DRI03.0-F-COORD.ZZZZ)	0.500	0	0.500							
ค่าประสานงานโครงการ (P-DRI03.0-F-COORD.ZZZZ)	4.614	4.351	0.263							
ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง(โอนไปเบิกในหมายเลขงานจ้างเหมา)	2.222	0.000	2.222							
ค่าใช้จ่ายหน้างานงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยเปลี่ยนสาย	63.000	60.150	2.850							
เป็นชนิดหุ้มฉนวน (SAC) ในตัวเมือง										
ค่าใช้จ่ายหน้างานงานก่อสร้างระบบจำหน่ายชั่วคราว	0.000	0.000	0.000							
เพื่อก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.										
ค่าใช้จ่ายหน้างานงานปรับปรุงระบบจำหน่าย	3.380	6.948	-3.568							
ใต้ไลน์สายส่งระบบ 115 เควี.										
ค่าพัสดุรองกระจ่ายให้ กฟพ.จัดซื้อ(P-DRI03.0-F-AAF57.6000)	6.052	6.052	0.000							
ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2555 (P-DRI03.0-F-EITBF.2000)	16.570	14.647	1.923							
ค่าพัสดุขาดแคลนกระจ่ายให้ กฟพ.จัดซื้อ (P-DRI03.0-F-EITBF.1000)	7.860	7.860	0.000							
รวม	110.334	106.144	4.190							
