



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟผ.๓

ถึง ผบ.๒

เลขที่ ฉ.๓ กกค.(จร.)

วันที่

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ คพฟ.๓ (สถานะ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)

เรียน อผ.บ.๒

ตามที่ กฟผ.๓ ได้รับจัดสรรปริมาณงานก่อสร้างและงบประมาณตามโครงการ คพฟ.๓ ให้ดำเนินการ จำนวน ๔๐๒ วงจร-กม.(ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕) เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กฟผ.๓ นั้น
กฟผ.๓ ได้จัดทำข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ คพฟ.๓ พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ (เอกสารแนบ จำนวน ๔ แผ่น)

- ๑.อนุมัติหลักการ จำนวน ๔๐๒ งาน ปริมาณงาน ๕๖๒.๗๔ วงจร-กม.
- ๒.งานก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO+CLSD)จำนวน ๓๘๑ งาน ปริมาณงาน ๔๘๘.๙๙ วงจร-กม.
- ๓.งานอยู่ระหว่างก่อสร้าง(REL) จำนวน ๑๙ งาน ปริมาณงาน ๗๑.๙๒ วงจร-กม.
- ๔.รอดำเนินการ(CRTD) จำนวน ๒ งาน ปริมาณงาน ๐.๘๔ วงจร-กม.
- ๕.ปิดงานก่อสร้างแล้ว(C LSD) จำนวน ๓๘๕ งาน ปริมาณงาน ๔๘๔.๑๗ วงจร-กม.
- ๖.รอปิดงานก่อสร้าง(TECO) จำนวน ๖ งาน ปริมาณงาน ๕.๘๑ วงจร-กม.
- ๗.ผลงานสะสมทั้งโครงการ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๔๘๘.๙๙ วงจร-กม.

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ <http://Intranet.pca.co.th/>รับ-ส่งข้อมูล กฟผ.๓/
ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ/กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้าง
ระบบจำหน่าย (ผจร.)/สรุปสถานะโครงการ คพฟ.๓ มกราคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สมชาย บรรณาส

(นายสมชาย บรรณาส)

รฟว.๑.๓ รักษาการแทน อ.๑.๓

รฟว.๑.๓ รักษาการแทน อ.๑.๓

ที่ ฉ.๓ กกค.(จร.) ๒๕๖๒-๔ ก.พ. ๒๕๖๒

๐ ๔ ก.พ. ๒๕๖๒

เรียน อผ.บ.๓(อก.บ.), อผ.บ.๑.๓(อก.ว. , อก.ค.) , ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓
- เพื่อโปรดทราบ และเร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

(นายสมชาย บรรณาส)

รฟว.๑.๓ รักษาการแทน อ.๑.๓

๐ ๔ ก.พ. ๒๕๖๒

แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เบอร์โทร. (๒๓)๑๐๖๗

สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ คขพ.3 ในเขต กฟอ.3

เดือน ม.ค.2562

ที่	กฟพ.อุตรรวมงาน	อนุมัติ (1)		ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย	เปอร์เซ็นต์	ก่อสร้างแล้วเสร็จ (2)		ปิดงาน กส.แล้ว (5)		รอปิดงาน (6)		เปอร์เซ็นต์	อยู่ระหว่างก่อสร้าง (3)		รอดำเนินการ (4)	
		งาน	วงจร-กม.	หน่วยงานที่อนุมัติ	หน่วยงานที่เบิก	เบิกจ่าย	TECO+CLSD		CLSD		TECO		การปิดงาน	REL		CRTD	
				บาท	บาท	%	งาน	วงจร-กม.(7)	งาน	วงจร-กม.	งาน	วงจร-กม.	%	งาน	วงจร-กม.	งาน	วงจร-กม.
1	นครราชสีมา	95	54.05	17,412,474.00	8,212,443	47.16%	88	44.75	83	38.94	5	5.81	92.63%	5	8.46	* 2	0.84
2	นครราชสีมา2 (ททล.)	26	18.50	6,529,493.00	2,764,737	42.34%	26	18.50	26	18.50	-	-	100.00%	-	-	-	-
3	นครราชสีมา3 (สรน.)	17	35.73	11,995,119.00	11,859,806	98.87%	17	35.73	17	35.73	-	-	100.00%	-	-	-	-
4	สีคิ้ว	21	81.29	28,034,710.39	26,648,273	95.05%	19	55.67	19	55.67	-	-	90.48%	2	25.62	-	-
5	ปากช่อง	23	66.57	19,422,329.00	10,568,992	54.42%	22	48.87	22	48.87	-	-	95.65%	1	17.70	-	-
6	โชคชัย	28	28.12	7,308,308.00	5,180,161	70.88%	27	22.30	27	22.30	-	-	96.43%	1	5.82	-	-
7	บัวใหญ่	15	12.81	3,145,884.00	2,153,548	68.46%	15	12.81	15	12.81	-	-	100.00%	-	-	-	-
8	พิมาย	23	24.88	12,844,753.00	5,198,217	40.47%	16	22.76	16	22.76	-	-	69.57%	7	2.12	-	-
9	ปักธงชัย	10	28.23	11,868,959.00	6,619,970	55.78%	10	28.23	10	28.23	-	-	100.00%	-	-	-	-
10	บุรีรัมย์	57	51.37	18,680,874.82	13,276,768	71.07%	55	42.67	54	42.67	1	-	96.49%	2	8.70	-	-
11	นางรอง	30	72.51	20,167,241.00	11,147,749	55.28%	30	72.51	30	72.51	-	-	100.00%	-	-	-	-
12	สุรินทร์	12	12.09	2,089,010.00	1,218,200	58.31%	12	12.09	12	12.09	-	-	100.00%	-	-	-	-
13	ปราสาท	8	15.00	4,838,774.00	3,164,950	65.41%	7	11.50	7	11.50	-	-	87.50%	1	3.50	-	-
14	ชัยภูมิ	44	60.51	15,673,285.00	12,435,140	79.34%	44	60.51	44	60.51	-	-	100.00%	-	-	-	-
15	อุทัย	3	1.10	689,890.00	445,765	64.61%	3	1.10	3	1.10	-	-	100.00%	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		412	562.74	180,701,104.21	120,894,720	66.90%	391	489.99	385	484.17	6	5.81	94.90%	19	71.92	2	0.84

หมายเหตุ - กฟอ.สีคิ้ว หักค่าใช้จ่ายหน้างานการจ้างก่อสร้าง สฟ.สีคิ้ว จำนวน 76,211,159.72 บาท เรียบร้อยแล้ว

- กฟอ.บุรีรัมย์ หักค่าใช้จ่ายหน้างานรวมการจ้างก่อสร้าง สฟ.บุรีรัมย์ จำนวน 75,178,780.87 บาท เรียบร้อยแล้ว

- กฟอ.พิมายหักค่าใช้จ่ายงานจ้างเหมา UG อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จำนวน 54,413,585.5 บาท เรียบร้อยแล้ว


- งานสถานะ CRTD รอยยกเลิก จำนวน 2 งาน

แผนและผลการก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการ คชฟ.3 ปี 2562

วงจร-กม.

ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2562)


เดือน ม.ค.2562

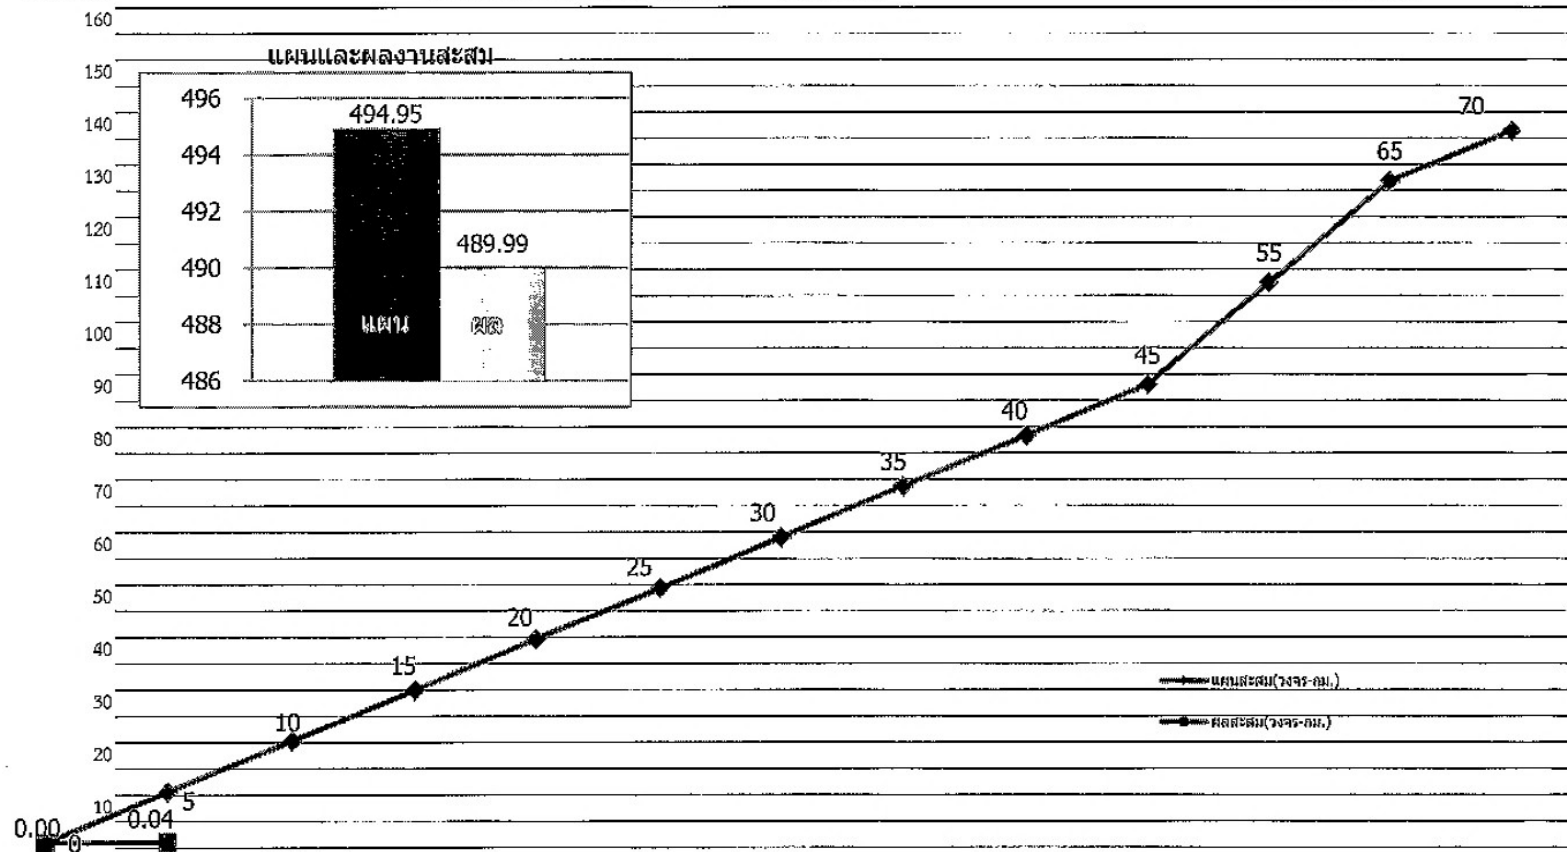[illegible]

แผนและผลการก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการ คขฟ.3 ปี 2562

ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2562)

เดือน ม.ค.2562

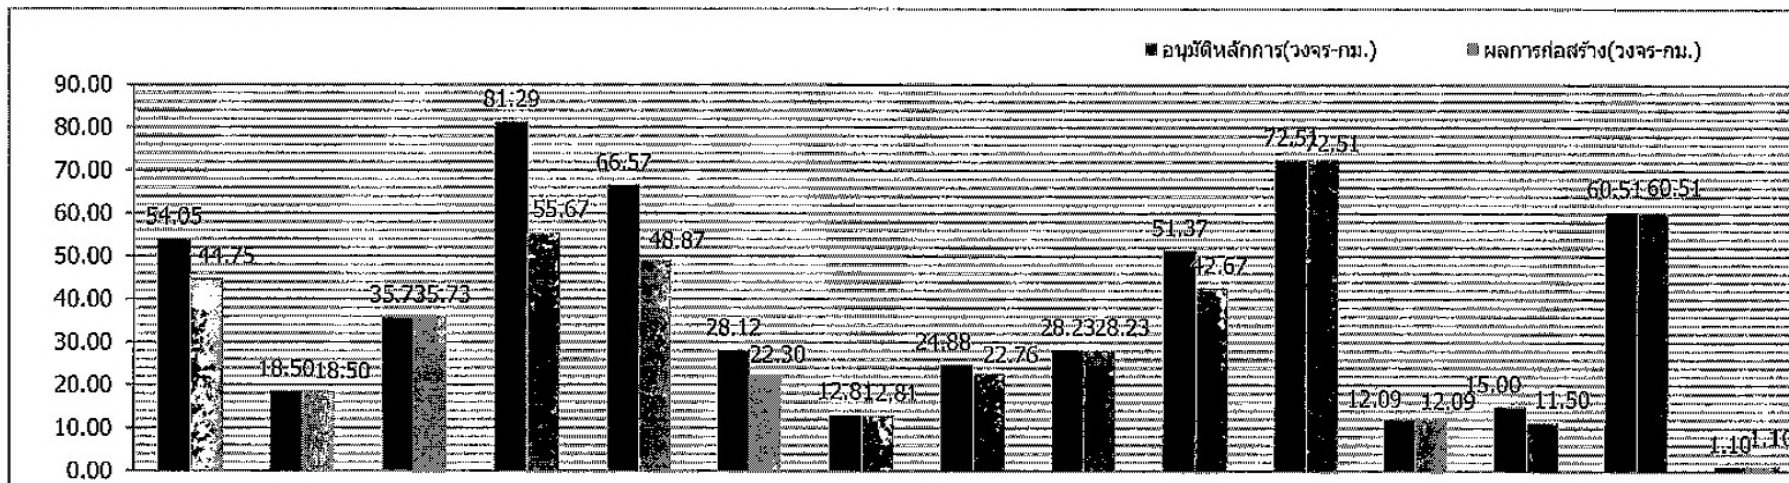

กฟฟ.	นม.	ทพถ.	สรน.	สคว.	ปชง.	ชช.	บุญ.	พม.	ปธ.	บร.	นร.	สร.	ปส.	ชย.	ภข.	รวม
หลักการ(วงจร-กม.)	54.05	18.50	35.73	81.29	66.57	28.12	12.81	24.88	28.23	51.37	72.51	12.09	15.00	60.51	1.10	562.74
ก่อสร้าง(วงจร-กม.)	44.75	18.50	35.73	55.67	48.87	22.30	12.81	22.76	28.23	42.67	72.51	12.09	11.50	60.51	1.10	489.99
ขั้นการก่อสร้าง	82.80%	100.00%	100.00%	68.48%	73.41%	79.29%	100.00%	91.48%	100.00%	83.06%	100.00%	100.00%	76.67%	100.00%	100.00%	87.07%

สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ คขฟ.3 ในเขต กฟล.3 เป็นวงจร-กม.

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตาม คพฟ.3 ในส่วนที่ กพฉ.3 ได้รับการจัดสรร

ถึงเดือนมกราคม 2562

รายละเอียด	งบประมาณ (ล้านบาท)				ปริมาณงาน (วงจร-กม.)					
	ได้รับจัดสรร ปี 54-59	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ทั้งโครงการ	ได้รับจัดสรรปี 54-60					
					แผนงาน	สำรวจออกแบบ		การก่อสร้าง		
						สำรวจ ออกแบบแล้ว	อยู่ระหว่าง ออกแบบ	ก่อสร้างแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
ค่าประสานงานโครงการ และค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง	6.136	6.136	0	402	562.74	562.74	-	489.99	71.91	0.84
ค่าริเริ่มโครงการ และค่าสำรวจออกแบบ (P-DRI03.0-F-COORD.ZZZZ)	0.500	0	0.500							
ค่าประสานงานโครงการ (P-DRI03.0-F-COORD.ZZZZ)	4.614	4.351	0.263							
ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง(โอนไปเบิกในหมายเลขงานจ้างเหมา)	2.222	0.000	2.222							
ค่าใช้จ่ายหน้างานงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยเปลี่ยนสาย	63.000	75.000	-12.000							
เป็นชนิดหุ้มฉนวน (SAC) ในตัวเมือง										
ค่าใช้จ่ายหน้างานงานก่อสร้างระบบจำหน่ายชั่วคราว	0.000	0.000	0.000							
เพื่อก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เครื.										
ค่าใช้จ่ายหน้างานงานปรับปรุงระบบจำหน่าย	3.380	8.600	-5.220							
ใต้ไลน์สายส่งระบบ 115 เครื.										
ค่าวัสดุรองกระจายให้ กฟช.จัดซื้อ(P-DRI03.0-F-AAF57.6000)	6.052	6.052	0.000							
ค่าผลิตถังดินซีเมนต์ปี 2555 (P-DRI03.0-F-EITBF.2000)	16.570	14.647	1.923							
ค่าวัสดุขาดแคลนกระจายให้ กฟช.จัดซื้อ (P-DRI03.0-F-EITBF.1000)	7.860	7.860	0.000							
รวม	110.334	122.646	-12.312							
