



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟฉ.๓

ถึง ผบ.๒

เลขที่ ฉ.๓ กกค.(จร.) ๕๕๕/๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ คชฟ.๓ (สถานะ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

เรียน ผ.บ.๒

ตามที่ กฟฉ.๓ ได้รับจัดสรรปริมาณงานก่อสร้างและงบประมาณตามโครงการ คชฟ.๓ ให้ดำเนินการ จำนวน ๔๐๒ วงจร-กม.(ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕) เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ กฟฉ.๓ นั้น กฟฉ.๓ ได้จัดทำข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ คชฟ.๓ พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ (เอกสารแนบ จำนวน ๔ แผ่น)

- ๑.อนุมัติหลักการ จำนวน ๔๐๑ งาน ปริมาณงาน ๕๖๒.๗๔ วงจร-กม.
- ๒.งานก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO+CLSD)จำนวน ๓๘๒ งาน ปริมาณงาน ๔๙๒.๕๑ วงจร-กม.
- ๓.งานอยู่ระหว่างก่อสร้าง(REL) จำนวน ๑๗ งาน ปริมาณงาน ๖๙.๓๙ วงจร-กม.
- ๔.รอดำเนินการ(CRTD) จำนวน ๒ งาน ปริมาณงาน ๐.๘๔ วงจร-กม.
- ๕.ปิดงานก่อสร้างแล้ว(CLSD) จำนวน ๓๘๖ งาน ปริมาณงาน ๔๘๔.๑๗ วงจร-กม.
- ๖.รอปิดงานก่อสร้าง(TECO) จำนวน ๖ งาน ปริมาณงาน ๘.๓๔ วงจร-กม.
- ๗.ผลงานสะสมทั้งโครงการ ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๔๙๒.๕๑ วงจร-กม.

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [http://intranet.pea.co.th/รับ-ส่งข้อมูล กฟฉ.๓/ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ/กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย \(ผจร.\)/สรุปสถานะโครงการ คชฟ.๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒](http://intranet.pea.co.th/รับ-ส่งข้อมูล กฟฉ.๓/ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ/กองก่อสร้างและบริหารโครงการ/แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย (ผจร.)/สรุปสถานะโครงการ คชฟ.๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายจิรธรณ์ คัตัญญุทธอง)

อ.พ.ว.บ.ฉ.๓ รักษาการแทน ช.ช.ฉ.๓

สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ คพฟ.3 ในเขต กพอ.3

เดือน ก.พ.2562

ที่	กพฟ.จัดรวมงาน	อนุมัติ (1)		ค่าใช้จ่าย หน่วยงานที่อนุมัติ	ค่าใช้จ่าย หน่วยงานที่เบิก	เปอร์เซ็นต์ เบิกจ่าย	ก่อสร้างแล้วเสร็จ (2)		ปิดงาน กส.แล้ว (5)		รอปิดงาน (6)		เปอร์เซ็นต์ การปิดงาน	อยู่ระหว่างก่อสร้าง (3)		รอดำเนินการ (4)	
		งาน	วงจร-กม.	บาท	บาท	%	TECO+CLSD		CLSD		TECO		%	REL		CRTD	
							งาน	วงจร-กม.(7)	งาน	วงจร-กม.	งาน	วงจร-กม.		งาน	วงจร-กม.	งาน	วงจร-กม.
1	นครราชสีมา	95	54.05	17,412,474.00	8,212,443	47.16%	89	47.28	83	38.94	6	8.34	93.68%	4	5.93	* 2	0.84
2	นครราชสีมา2 (ททล.)	26	18.50	6,529,493.00	2,764,737	42.34%	26	18.50	26	18.50	-	-	100.00%	-	-	-	-
3	นครราชสีมา3 (สรน.)	17	35.73	11,995,119.00	11,859,806	98.87%	17	35.73	17	35.73	-	-	100.00%	-	-	-	-
4	สีคิ้ว	21	81.29	28,034,710.39	26,651,130	95.06%	19	55.67	19	55.67	-	-	90.48%	2	25.62	-	-
5	ปากช่อง	23	66.57	19,422,329.00	10,575,348	54.45%	22	48.87	22	48.87	-	-	95.65%	1	17.70	-	-
6	โชคชัย	28	28.12	7,308,308.00	5,195,207	71.09%	27	22.30	27	22.30	-	-	96.43%	1	5.82	-	-
7	บัวใหญ่	15	12.81	3,145,884.00	2,153,548	68.46%	15	12.81	15	12.81	-	-	100.00%	-	-	-	-
8	พิมาย	23	24.88	12,844,753.00	5,230,786	40.72%	16	22.76	16	22.76	-	-	69.57%	7	2.12	-	-
9	ปักธงชัย	10	28.23	11,868,959.00	6,619,970	55.78%	10	28.23	10	28.23	-	-	100.00%	-	-	-	-
10	บุรีรัมย์	56	51.37	18,680,874.82	13,276,768	71.07%	55	42.67	55	42.67	-	-	98.21%	1	8.70	-	-
11	นางรอง	30	72.51	20,167,241.00	11,147,749	55.28%	30	72.51	30	72.51	-	-	100.00%	-	-	-	-
12	สุรินทร์	12	12.09	2,089,010.00	1,218,200	58.31%	12	12.09	12	12.09	-	-	100.00%	-	-	-	-
13	ปราสาท	8	15.00	4,838,774.00	3,164,950	65.41%	7	11.50	7	11.50	-	-	87.50%	1	3.50	-	-
14	ชัยภูมิ	44	60.51	15,673,285.00	12,435,140	79.34%	44	60.51	44	60.51	-	-	100.00%	-	-	-	-
15	ภูเขียว	3	1.10	689,890.00	445,765	64.61%	3	1.10	3	1.10	-	-	100.00%	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		411	562.74	180,701,104.21	120,951,548	66.93%	392	492.51	386	484.17	6	8.34	95.38%	17	69.39	2	0.84

หมายเหตุ - กพอ.สีคิ้ว หักค่าใช้จ่ายหน่วยงานการจ้างก่อสร้าง สฟ.สีคิ้ว จำนวน 76,211,159.72 บาท เรียบร้อยแล้ว

- กพจ.บุรีรัมย์ หักค่าใช้จ่ายหน่วยงานรวมการจ้างก่อสร้าง สฟ.บุรีรัมย์1 จำนวน 75,178,780.87 บาท เรียบร้อยแล้ว

- กพอ.พิมายหักค่าใช้จ่ายงานจ้างเหมา UG อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จำนวน 54,413,585.5 บาท เรียบร้อยแล้ว


- งานสถานะ CRTD รอยกเลิก จำนวน 2 งาน

แผนและผลการก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการ คชฟ.3 ปี 2562

วงจร-กม.

ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2562)


เดือน ก.พ.2562

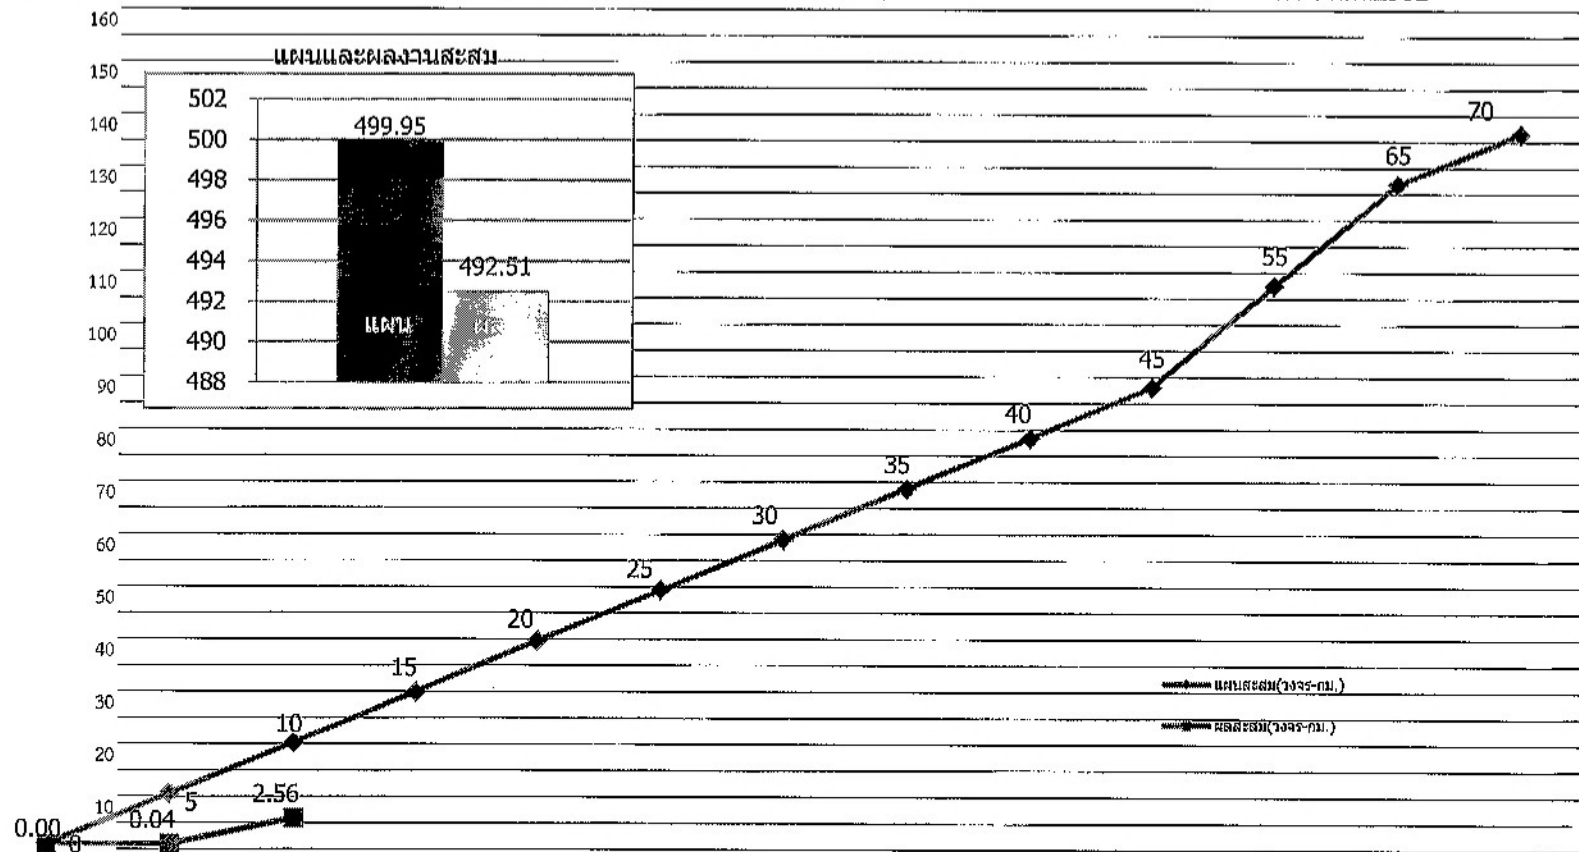[illegible]

แผนและผลการก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการ คขฟ.3 ปี 2562

ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2562)

เดือน ก.พ.2562

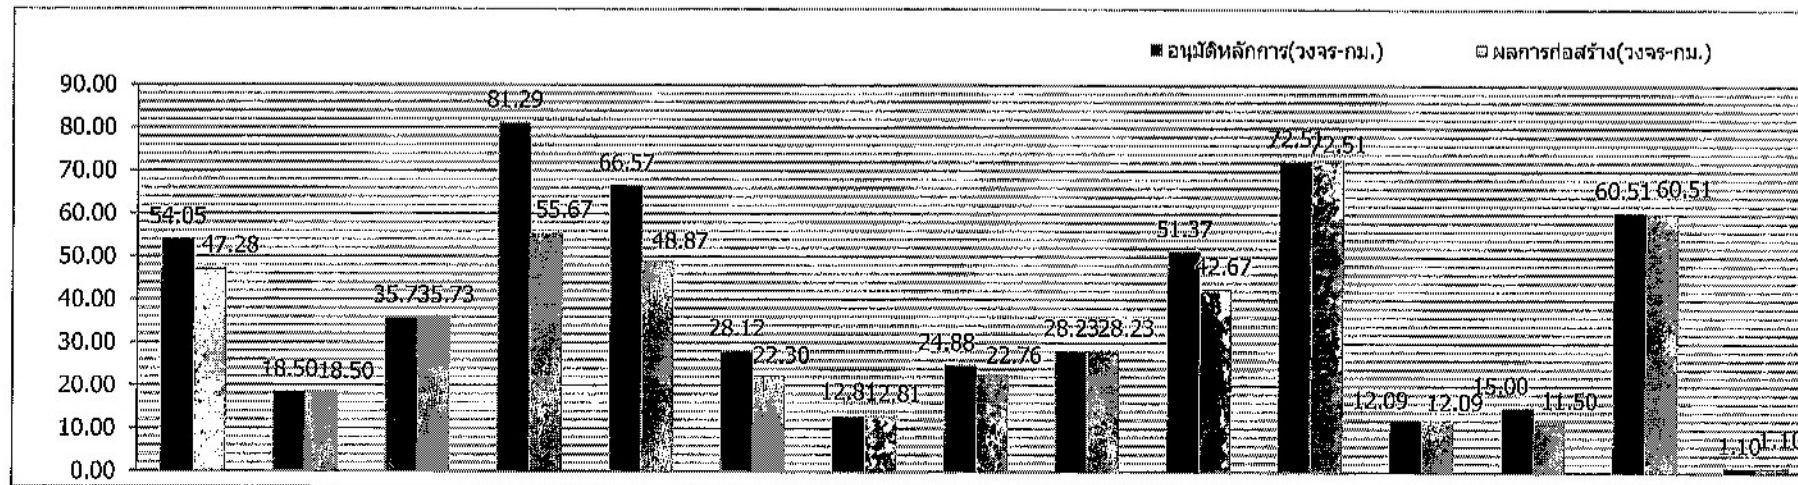

กพฟ.	นม.	ททล.	สรน.	สคว.	ปชง.	ขช.	บุญ.	พน.	ปธ.	บร.	นร.	สร.	ปส.	ชย.	ภข.	รวม
อณุมัติหลักการ(วงจร-กม.)	54.05	18.50	35.73	81.29	66.57	28.12	12.81	24.88	28.23	51.37	72.51	12.09	15.00	60.51	1.10	562.74
ผลการก่อสร้าง(วงจร-กม.)	47.28	18.50	35.73	55.67	48.87	22.30	12.81	22.76	28.23	42.67	72.51	12.09	11.50	60.51	1.10	492.51
เปอร์เซ็นต์การก่อสร้าง	87.47%	100.00%	100.00%	68.48%	73.41%	79.29%	100.00%	91.48%	100.00%	83.06%	100.00%	100.00%	76.67%	100.00%	100.00%	87.52%

หมายเหตุ สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ คขฟ.3 ในเขต กพด.3 เป็นวงจร-กม.

(Handwritten signature)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตาม คชพ.3 ในส่วนที่ กพฉ.3 ได้รับการจัดสรร
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ที่	รายละเอียด	งบประมาณ (ล้านบาท)				ปริมาณงาน (วงจร-กม.)					
		ได้รับจัดสรร ปี 54-59	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ทั้งโครงการ	ได้รับจัดสรรปี 54-62					
						แผนงาน	สำรวจออกแบบ		การก่อสร้าง		
						สำรวจ ออกแบบแล้ว	อยู่ระหว่าง ออกแบบ	ก่อสร้างแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าประสานงานโครงการ และค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง	6.136	6.136	0							
1.1	ค่าริเริ่มโครงการ และค่าสำรวจออกแบบ (P-DRI03.0-F-COORD.ZZZZ)	0.500	0	0.500							
1.2	ค่าประสานงานโครงการ (P-DRI03.0-F-COORD.ZZZZ)	4.614	4.351	0.263							
1.3	ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้าง(โอนไปเบิกในหมายเลขงานจ้างเหมา)	2.222	0.000	2.222							
2	ค่าใช้จ่ายหน้างานงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยเปลี่ยนสายเป็นชนิดหุ้มฉนวน (SAC) ในตัวเมือง	63.000	75.000	-12.000	402	562.74	562.74	-	492.51	69.39	0.84
3	ค่าใช้จ่ายหน้างานงานก่อสร้างระบบจำหน่ายชั่วคราวเพื่อก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เครวี.	0.000	0.000	0.000							
4	ค่าใช้จ่ายหน้างานงานปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้โล่สายส่งระบบ 115 เครวี.	3.380	8.600	-5.220							
5	ค่าวัสดุรองกระจายให้ กฟข.จัดซื้อ(P-DRI03.0-F-AAF57.6000)	6.052	6.052	0.000							
6	ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีตปี 2555 (P-DRI03.0-F-EITBF.2000)	16.570	14.647	1.923							
7	ค่าวัสดุขาดแคลนกระจายให้ กฟข.จัดซื้อ (P-DRI03.0-F-EITBF.1000)	7.860	7.860	0.000							
	รวม	110.334	122.646	-12.312							
