



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

๑(๑)

จาก คณะกรรมการตรวจรับฯ ถึง ผจก.กฟภ.นภ.
เลขที่ ฉ.อนภ.(คป)- /๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการตรวจรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร
อ้างถึง ๑) ใบแจ้งหนี้ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด เลขที่ BV๑๕๐๒๑๒ ลว. ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟภ.นภ.

๑.เรื่องเดิม

ตามอ้างถึง บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ขอเบิกเงินค่าเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น เป็นเงิน ๒๖๓,๔๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้น.

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตาม PO ๓๐๐๐๘๙๒๒๓๑ ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๘ ทางบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้รับทราบเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๘ ซึ่งต้องจัดส่ง เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น จัดส่ง กฟภ.นภ.ภายในไม่เกิน ๓๐ วัน หลังวันลงนามในเงื่อนไข (ภายในไม่เกิน วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๘)

๒.๒ ตามบันทึกที่อ้างถึงฉ.อนภ.(คป)-๕๘/๒๕๕๘ ลว.๑๓ ก.พ.๒๕๕๘ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปีของกฟภ.นภ.แต่ละจุดจัดส่งเป็นผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตประจำปี ๒๕๕๘ ของ กฟภ.นภ. ประกอบด้วย ดังนี้

- ๑.นายขวัญชัย เจียบแหลม ผจก.กฟภ.นภ.
- ๒.นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชผ.คป.กฟภ.นภ.
- ๓.นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชผ.ปบ.กฟภ.นภ.

๒.๓ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ใบส่งของเลขที่	จำนวนที่ส่งมอบ(ต้น)	วันที่จัดส่ง	หมายเหตุ
๑	๐๒๔	๒๑	๑๘ ก.พ. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๒	๐๓๐	๑๙	๑๘ ก.พ. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
๓	๐๔๒	๒๐	๒๓ ก.พ. ๕๘	ส่งมอบภายในกำหนด
รวมเป็น		๖๐ ต้น	ส่งมอบภายในกำหนด	

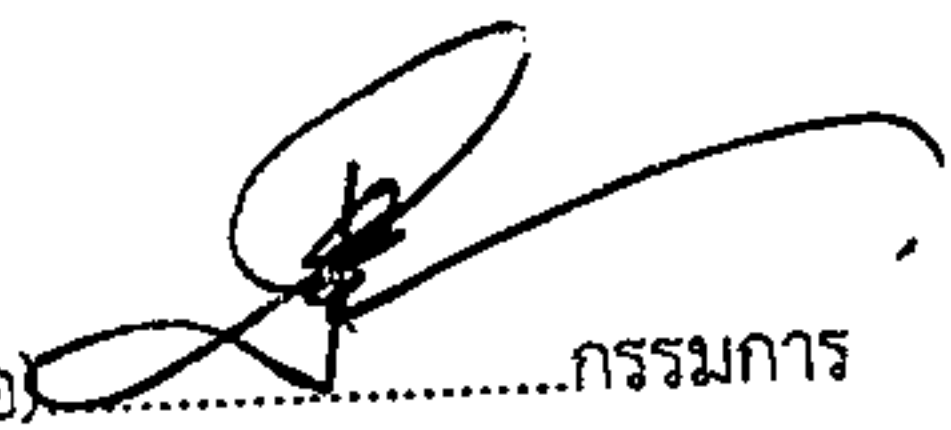
ข้อเสนอแนะ


คณะกรรมการตรวจรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต พิจารณาตรวจสอบแล้ว เนื่องจากบริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่ง เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต ของ กฟภ. แล้ว ดังนั้น จึง เห็นควรรับเสาคอนกรีต ๑๒ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น ไว้ใช้งานและนำเรียน ผจก.กฟภ.นภ. พิจารณานุมัติสั่งจ่ายเงินให้ บริษัท เบส-แพค คอนกรีต จำกัด ตามรายการ ดังนี้

- ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑ รายการ
- จ่าย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๒๖๓,๔๐๐.- บาท
เป็น ๑๘,๕๓๘.- บาท
รวมเป็นเงิน ๒๘๑,๙๓๘ บาท

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายขวัญชัย เขียบแหลม พว.กส.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายชาญณรงค์ ถาวะโร ชพ.คบ.กฟจ.นภ.

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายสุรจันทร์ ศรีจันทร์ ชพ.ปป.กฟจ.นภ.

๒๐๖.๑๗

อ.วิมลวรรณ



26 ก.พ. 2558
