



สัญญาเลขที่...12/ 2561....

สัญญาจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเขตคลองสาน แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่...19..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2561..... ระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดย...นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์...ตำแหน่ง...ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร...ทำการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยรับมอบอำนาจตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2718/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แวนเทจ แอสเสท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่...45...หมู่ที่...-...ซอย...พุทธบูชา 4....ถนน.....ตำบล / แขวง....บางมด....อำเภอ / เขต....จอมทอง....จังหวัด....กรุงเทพมหานคร....โดย.....นายสรพล พุกภัยพงศ์รัตน์..... เป็นกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร เลขที่...สจ.2 001301....ลงวันที่...8...เดือน...มกราคม...พ.ศ. ...2561...และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ...-...เดือน...-...พ.ศ.-...แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน.....ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ..... ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา.....

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 899,000.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน).....
ณ แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใด
เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

รายการสัญญา
เลขที่...12/2561...วันที่...พ.ศ. ...2561...
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 2.1 | ผนวก 1 แบบรูป..แบบเลขที่ ขคส. 12/2561 | จำนวน...7...แผ่น |
| 2.2 | ผนวก 2 รายละเอียด.....รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ
รายการเลขที่ ขคส. 12/2561..... | จำนวน...5...แผ่น |
| 2.3 | ผนวก 3 ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน...1...หน้า |
| 2.4 | ผนวก 4 ใบเสนอราคา | จำนวน...2...หน้า |
| 2.5 | ผนวก 5 รายการมาตรฐานงานอาคารของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 | จำนวน....1...เล่ม |
| 2.6 | ผนวก 6 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
..... | จำนวน...5...หน้า |
| 2.7 | ผนวก 7 รายละเอียดรายการทั่วไปแนบท้ายสัญญาจ้าง | จำนวน...2...หน้า |
| 2.8 | ผนวก 8 รายละเอียดแนบท้ายสัญญา | จำนวน...1...หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น....หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน).....สาขา.....สำนักพหลโยธิน.....เลขที่...100017000092.....ลงวันที่....19....เดือน....มีนาคม... พ.ศ. ...2561... เป็นจำนวนเงิน.....44,950.-.....บาท (.....สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ...5.....(ห้า).... ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้


กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบ ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้าง พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวง ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะมีเหตุขึ้นคร่าวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนคืนให้ผู้รับ จ้างหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน7.....(เจ็ด).... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

รายการสัญญา

เลขที่ 12/2561
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



ข้อ 4 (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....899,000.-.....บาท (...แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน....58,813.08....บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 3

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกหรือค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

4.1 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

4.2 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของรายการนั้นตามสัญญา โดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายค่างานตามสัญญา

4.4 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น ตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อกรจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่สำเร็จจริงเมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเช็คสั่งจ่าย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....กสิกรไทย จำกัด (มหาชน).....สาขา.....สำนักงานใหญ่.....เลขที่บัญชี.....799-2-79356-9..... หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนมีการเบิกจ่ายเงินด้วย

VANTAGE
ASSET CO., LTD.

เลขที่.....12/2561.....วันที่.....ม.ค. ๒๕๖๑.....
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง...../4.....
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง.....

ข้อ 4 (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน.....บาท
(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน
เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1. เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....
.....
.....
ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ 2. เป็นจำนวนเงิน.....บาท(.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....
.....
.....
ให้แล้วเสร็จภายใน.....

..... ฯลฯ.....
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเช็คสั่งจ่าย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....
หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงธนาคารและเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนมีการเบิกจ่ายเงินด้วย

ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท
(.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตาม
เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะ
เรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

รายการสัญญา

เลขที่.....12/2561.....วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

5.3 (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

5.4 เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

5.6 (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตาม 5.3 (ก)

5.6 (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 (ข)

ข้อ 6 การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....บาท (.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือคำประกันของธนาคาร ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

รายการสัญญา

12/2561 ลงชื่อ ๓๓ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



VANTAGE
ASSET CO., LTD.

ข้อ 7 (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 7 (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....20.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.2561.....และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....17.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.2561.....(.....90.....วัน) (นับถัดจากวันลงนามสัญญา) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็เหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดตามข้อ 7 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด.....2.....(.....สอง.....) ปี.....(.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....15.....(สิบห้า).....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายของทั้งสิ้น

รายการสัญญา

เลขที่.....12/2561.....วันที่.....๑๙.....ม.ค. ๒๕๖๑.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ผู้ว่าจ้าง.....
ผู้รับจ้าง.....

VANTAGE
ASSET CO., LTD.

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานแทนนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 9 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....(.....) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ 10 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 11 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)


ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อนี้เท่านั้น

รายการสัญญา

วันที่ 12/2561 วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



VANTAGE
ASSET CO., LTD.

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคลากรภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ไขต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 12 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 13 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ 14 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 15 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง


ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้

รายการสัญญา

เลขที่.....12/2561.....วันที่.....๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑.....

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง.....

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง.....



VANTAGE
ASSET CO., LTD.

/9. ...

ข้อ 16 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ 17 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 899.- บาท (...แปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินละ- บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร


ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 19 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

รายการสัญญา

เลขที่ 12/2561 วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



/10. ...

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 20 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 21 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 22 การใช้เรือไทย


ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (BILL OF LADING) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

รายการสัญญา

เลขที่.....12/2561.....วันที่.....ม.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



VANTAGE
ASSET CO., LTD.

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใดดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 23 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันที่กระทรวงแรงงานรับรอง.....หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ...10.....ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

23.1 ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง (ตามวุฒิ) ช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างประปา ช่างไฟฟ้า

ช่างสี และอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

กรณีเป็นงานจ้างที่มีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า กรุงเทพมหานครจะพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้เมื่อผู้ชนะการประกวดราคาได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ เรียบร้อยแล้ว

1. ปลุกสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวมีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมที่จะเข้าทำงานได้
2. จัดเตรียมสิ่งป้องกันมลภาวะที่เหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอ
3. จัดทำและติดตั้งป้ายประกาศและป้ายแนะนำในการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างป้ายเตือน เครื่องหมายและสัญญาณต่าง ๆ ต้องมีเพียงพอและมีสำรองอีก 1 ชุด เพื่อใช้ในการป้องกันอันตราย ทั้งกลางวันและกลางคืน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายสรพล พฤกษ์พงศ์รัตน์.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นายพัฒนิก สาดราภัย.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นายชนาสิน ชัยอักษรเวช.....)

(ลงชื่อ).....พยานและผู้พิมพ์
(.....นางสาวสุกัญญา กัมพะลา.....)




รายละเอียดรายการทั่วไปแนบท้ายสัญญาจ้าง

- (1) ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าในการก่อสร้างจะไม่กระทำการใด ๆ ให้เป็นการกีดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะที่ผ่านไปมาและเมื่อเลิกงานแล้วก็จะเก็บยานพาหนะและอุปกรณ์การก่อสร้างไว้ภายในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น
- (2) หากมิได้รับอนุญาตให้ปิดการจราจรในถนน ตรอก ซอย ที่ทำการก่อสร้างหรือปรับปรุงผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ให้สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ
- (3) ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้ดิน ทราบ หิน หรือวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ตกลงในบ่อพักหรือท่อระบายน้ำเป็นอันตราย และถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ต้องนำวัสดุดังกล่าวขึ้นจากบ่อพักหรือท่อระบายน้ำให้หมดสิ้นโดยไม่ชักช้า
- (4) การขุดดินเพื่อวางท่อระบายน้ำซึ่งอาจทำให้ถนนหรือทางเท้าชำรุด ผู้รับจ้างต้องจัดทำกำแพงกันดินชั่วคราวเพื่อป้องกันการทรุดและดินที่ขุดขึ้นมาต้องไม่กองรูก่ำผิวจราจรในกรณีที่ไม่มีส่วนที่กอง ให้ผู้รับจ้างรับขนย้ายไปทันที
- (5) การขุดร่องดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ผู้รับจ้างต้องขุดเป็นระยะทางให้สัมพันธ์กับความสามารถในการวางท่อระบายน้ำลงในร่องดินห้ามมิให้ผู้รับจ้างขุดร่องดินยาวเกินความจำเป็นและการขุดผ่านทางแยกหรือทางเข้าบ้าน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุอื่นใดปูทับร่องที่ขุดเพื่อให้ยานพาหนะสามารถผ่านได้ หากผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุใดปูได้ภายใน 6 ชม. นับแต่วันเริ่มขุดและไม่มีกรปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการหลุมร่องดินเสียก่อน ส่วนท่อระบายน้ำที่นำมาให้ผู้รับจ้างวางเรียงให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะ
- (6) ในกรณีที่มีการระบายน้ำออกจากอาคารของประชาชน ผู้รับจ้างต้องเชื่อมท่อระบายน้ำของประชาชนเข้ากับท่อระบายน้ำที่สร้างขึ้นใหม่ โดยจัดทำให้เรียบร้อยและไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่เจ้าของอาคารในการระบายน้ำประจำวันด้วย
- (7) การซ่อมแซมบรูณะทางเท้าที่ชำรุดเศษวัสดุที่รื้อถอนอาคารหากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ผู้รับจ้างต้องขนย้ายไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างทันที กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ให้กองได้โดยไม่กีดขวางการสัญจรส่วนวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้เช่น หิน ทราบ ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้กองบนทางเท้าได้แต่ผู้รับจ้างต้องจัดทำคอกกันโดยไม่กีดขวางการสัญจรไปมา
- (8) ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนขนย้ายโรงงานชั่วคราวและวัสดุก่อสร้างให้หมดสิ้นภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานหรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้ารื้อถอนขนย้ายเองโดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการเข้าดำเนินการจากผู้รับจ้างได้

ตรวจแล้ว

รายการสัญญา

เลขที่.....12/2561.....วันที่.....๑๙ มิ.ค. ๒๕๖๑.....
ลงชื่อ.....นายศิริพงษ์ โกษมสุวรรณ.....
ลงชื่อ.....นาย.....
ลงชื่อ.....นาย.....



VANTAGE
ASSET CO., LTD.

(9) งานก่อสร้างในส่วนที่เป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ถือว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้มีการบ่มคอนกรีตครบ 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(10) ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์ จะขอต่ออายุสัญญาหรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลแห่งการนั้น พร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยยื่นที่ กองกลางสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้


(10.1) การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้สั่งจ้างก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาหรืออย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดอายุสัญญา

(10.2) การขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในเวลา ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาต่ออายุสัญญา

การยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาหรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา ที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิในการต่ออายุสัญญา

ตรวจสอบแล้ว

รายการสัญญา
เลขที่.....12/2561.....วันที่.....๑๕.....ม.ค. ๒๕๖๑.....
ลงชื่อ.....นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ.....ผู้ว่าจ้าง.....
ลงชื่อ.....ส.ท.อ. นพดล.....ผู้รับจ้าง.....



เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทรวมถึง งานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างาน จากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดหาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การทำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่นใน ประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانัน ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทงานจ้างคราวเดียวกันจะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้
4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิที่จะต้องเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว และให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคา ค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) + (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาจ้างต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาจ้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกเงินค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

รายการสัญญา

เลขที่.....12/2561 วันที่.....๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ตรวจแล้ว



VANTAGE
ASSET CO., LTD.

1. งานอาคาร

1. งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่นที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยินเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้า สำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 IT/IO + 0.10 CT/CO + 0.40 MT/MO + 0.10 ST/SO$

2. งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง ดินคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล ปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 IT/IO + 0.40 ET/EO + 0.20 FT/FO$

3. งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 AT/AO + 0.20 ET/EO + 0.10 FT/FO$


3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 MT/MO + 0.30 AT/AO + 0.20 ET/EO + 0.10 FT/FO$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 MT/MO + 0.40 AT/AO + 0.10 ET/EO + 0.10 FT/FO$

รายการสัญญา
เลขที่ 12/2561 วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



VANTAGE
ASSET CO., LTD.

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWET BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR.) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อกัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กงาน ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดสะพานรวมทั้งงานบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อกัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 IT / IO + 0.15 CT / CO + 0.15 MT / MO + 0.15 ST / SO$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 IT / IO + 0.15 CT / CO + 0.20 MT / MO + 0.25 ST / SO$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุเสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10 IT / IO + 0.05 CT / CO + 0.20 MT / MO + 0.40 ST / SO$


รายการสัญญา

เลขที่ 12/2561 วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ตรวจแล้ว

25

หน้า ๓ จาก ๓




VANTAGE
ASSET CO., LTD.

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
IT	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
IO	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
CT	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
CO	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
MT	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
MO	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ST	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
SO	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
GT	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GO	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
AT	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
AO	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ET	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
EO	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
FT	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
FO	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ACT	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACO	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
PVCT	=	ดัชนีราคาท่อ พีวีซี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCO	=	ดัชนีราคาท่อ พีวีซี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
GIPT	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPO	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
PET	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEO	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
WT	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
WO	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ตรวจแล้ว



นายศิริพงษ์ เกษมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองบริหารสัญญา
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

รายการสัญญา

เลขที่ 12/2561 วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อผู้รับจ้าง




VANTAGE
ASSET CO., LTD.

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มียานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนด ให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่าตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองประกวดราคา มากกว่า 4 % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4 % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4 % แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างาน ให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนี ราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

ตรวจแล้ว

รายการสัญญา
เลขที่ 12/2561 วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



รายละเอียดแนบท้ายสัญญางานปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ

1. ปรับปรุงอาคารอาคาร 1 และ 2 ตามแบบ ขคส.12/2561

- ติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 4 ชุด

ราคาชุดละ 21,681.31 บาท เป็นเงิน 86,725.24 บาท

- งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด) 24 จุด

ราคาจุดละ 783.- บาท เป็นเงิน 18,792.- บาท

- ติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างภาชนะ 24 ชุด

ราคาชุดละ 189.18 บาท เป็นเงิน 4,540.32 บาท

- สร้างท่อน้ำฝนสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาวประมาณ 12 ม.

ราคาเมตรละ 678.44 บาท เป็นเงิน 8,141.28 บาท

2. ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบ ขคส.12/2561

- ติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดมีแป้นในตัว เนื้อที่ประมาณ 46 ตร.ม.

ราคา ตร.ม.ละ 1,450.82.- บาท เป็นเงิน 66,737.72.- บาท

- สร้างรางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. ขนาด 6 นิ้ว ยาวประมาณ 29 ม.

ราคาเมตรละ 1,102.47.- บาท เป็นเงิน 31,971.63 บาท

- สร้างท่อน้ำฝนสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาวประมาณ 24 ม.

ราคาเมตรละ 678.44 บาท เป็นเงิน 16,282.56 บาท

3. ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ตามแบบ ขคส.12/2561

- ติดตั้งตู้บัวอิน ขนาด ก.0.60 x ย.6.00 x ส. 3.50 ม. (1 ชุด) ยาวประมาณ 6 ม.

ราคาเมตรละ 19,491.- บาท เป็นเงิน 116,946.- บาท

4. ปรับปรุงพื้นที่สนามโรงเรียน


- รื้อพื้นเดิมทิ้ง พร้อมปูพื้นยางสังเคราะห์ชนิดซูปเปอร์เรชั่นฮาร์ดคอร์ท สูตรน้ำ หนาเฉลี่ย 2 มม. พื้นที่ประมาณ 601 ตร.ม.

ราคา ตร.ม.ละ 913.25 บาท เป็นเงิน 548,863.25 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 899,000.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รายการสัญญา

เลขที่..... วันที่..... ค.ศ. ๒๕๖๑
ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง



รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ

รายการเลขที่ ขคส. 12/2561

วัตถุประสงค์

สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะทำดาปรับปรุงโรงเรียน
วัดสุวรรณ แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตามแบบและรายการ ดังนี้

1. รายการฉบับนี้เลขที่ ขคส. 12/2561
2. แบบเลขที่ ขคส. 12/2561
3. รายการมาตรฐานงานอาคาร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546



ปริมาณงาน

งานปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ ตามแบบ ขคส. 12/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปรับปรุงอาคาร 1 และ 2 ตามแบบ ขคส. 12/2561 ✓
- ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบ ขคส. 12/2561 ✓
- ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ตามแบบ ขคส. 12/2561 ✓

ตรวจแล้ว

ปรับปรุงพื้นที่สนามโรงเรียน


- รื้อพื้นเดิมทิ้ง พร้อมปูพื้นยางสังเคราะห์ ชนิดซูเปอร์เรซิ่นยาร์ดคอร์ทูลูตริค
หน้าผาเหล็ก สำนักงานเขตคลองสาน
- หนาเฉลี่ย 2 มม. เนื้อที่ประมาณ 601 ตร.ม. ✓

รายการสัญญา

เลขที่ 12/2561 วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



VANTAGE
ASSET CO., LTD.

ข้อกำหนดเฉพาะงาน

1. ในการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง และอุปสรรคต่างๆ หากมีหรือพบอุปสรรคใดๆ จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้ประสานงานและติดต่อแก้ไข ในการนี้ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ผู้รับจ้างจะเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
2. เนื่องจากงานก่อสร้างตามรายการฉบับนี้เป็นงานปรับปรุง ดังนั้นตำแหน่งระยะต่างๆ ที่กำหนดไว้จึงเป็นการกำหนดโดยสังเขป เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ปริมาณงานรวมจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าของเดิม และถือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเนื้องานตามรายการในสัญญาแต่ประการใด
3. ตำแหน่งที่ตั้งของส่วนที่จะทำการปรับปรุง ให้ถือระยะที่กำหนดในผังบริเวณหรือในกรณีที่ผังบริเวณขัดกับสถานที่ก่อสร้างจริง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องทางหลักวิชาช่าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้กำหนดรายการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในการวางตำแหน่งของส่วนที่จะปรับปรุงดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้เนื้องานของการก่อสร้างลดลงหรือค่าก่อสร้างต้องเปลี่ยนแปลงไปจากข้อสัญญา
4. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดการชำรุดเสียหายจากการดำเนินงานปรับปรุงครั้งนี้ โดยการเปลี่ยนให้ใหม่หรือปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรงและใช้การได้ดีตามสภาพเดิม
5. ในการดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยกับประชาชนที่อยู่ภายในสถานที่ และต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานของผู้รับจ้างเอง
6. ในกรณีที่มีการรื้อวัสดุหรือส่วนใดๆ ของอาคารออกนั้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการจัดเก็บขนย้ายออกไปทิ้ง พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย
7. วัสดุตกแต่งเช่นหินแกรนิต หินอ่อน หรือวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานตกแต่ง ที่มีรูปแบบลวดลายของวัสดุที่แตกต่างกัน ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุตัวอย่างหรือรายละเอียดประกอบเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาคัดเลือกวัสดุ และจะต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ชนิดเดียวกันในการก่อสร้างคราวเดียวกัน ให้ใช้ยี่ห้อเดียวกันเพื่อความกลมกลืนสวยงามและสะดวกในการซ่อมแซม
8. วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์ที่นำมาประกอบและติดตั้งต้องได้มาตรฐาน หรือคุณภาพสูงกว่าหรือเทียบเท่าวัสดุ อุปกรณ์เดิม
9. งานทาสี ต้องมีการเตรียมพื้นผิวในการทาสี ต้องทำความสะอาดให้แห้ง และปราศจาก

ตรวจสอบแล้ว

เจ้าพนักงานช่างไฟฟ้า
หัวหน้าช่างไฟฟ้า

เราทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาและตกลงกันแล้วว่างานนี้ให้ดำเนินการต่อไปได้
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

10. ให้รวมการบรรจุระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา และงานทาสีพื้นที่ส่วนที่ทำการ
ปรับปรุงและส่วนต่อเนื่อง

11. ระดับของส่วนที่จะทำการปรับปรุงจะกำหนดให้ ณ สถานที่ก่อสร้าง

รายการทั่วไป

1 สิ่งกีดขวางต่อการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างจัดการขนย้ายให้เรียบร้อยและผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ต่ออุบัติเหตุและอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอกซึ่งต้องเสียหายไปโดยความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

2 ผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของผู้ใช้เส้นทางนี้ ในระหว่างการก่อสร้างตลอดเวลา

3 เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว ก่อนส่งมอบงานของผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณสถานที่
ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ตรวจแล้ว

การดำเนินการทั่วไป นายศิริพงษ์ เกษมบุรุษพร

ใช้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญา

ฉบับที่ ๑๔๔๔/๒๕๖๑ เรื่องการจ้างงาน

1 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

เนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ บางส่วนเป็นการก่อสร้างด้วยฝีมือแรงงาน บางส่วนใช้วัสดุที่ผลิตขึ้น
โดยวิธีการอุตสาหกรรม การก่อสร้างจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนไปจากรูปแบบ และรายการได้บ้าง ดังนั้นวัสดุ
และฝีมือของสิ่งที่จัดทำขึ้นในระบบอุตสาหกรรม จึงอนุโลมให้มีการคลาดเคลื่อนได้ตามที่มาตรฐานระบบ
อุตสาหกรรมนั้นๆ กำหนดไว้ ตัวอย่าง เช่น ขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีต ยอมให้ใหญ่หรือเล็กกว่าขนาดที่
กำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่าความคลาดเคลื่อนที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงอนุโลมให้มีการคลาดเคลื่อน
ได้เช่นกัน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้นี้ ผู้กำหนดรายการเป็นผู้วินิจฉัยให้เป็นเด็ดขาดตามหลักวิชาช่างที่ดี
เพื่อให้เกิดผลดีต่อเจตนารมณ์ของการก่อสร้างครั้งนี้ กรณี การก่อสร้างปรับปรุงที่ก่อสร้างเดิมให้ถ้อยขนาดและ
ระยะของอาคารเดิมเป็นหลัก ปริมาณงานที่อยู่ในความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับข้างต้นจะไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างแต่อย่างใด และจะไม่ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาด้วย

2 แบบรายการ

รูปแบบรายการที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เท่านั้น การก่อสร้างจริงตามหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้องมีแบบรายละเอียดที่จำเป็นต้องจัดทำขณะก่อสร้าง
(SHOP DRAWING) และแบบที่สร้างจริง (AS-BUILT DRAWING) ซึ่งเป็นแบบเพิ่มเติมที่ผู้ออกแบบจะเป็นผู้
วินิจฉัยเพิ่มเติมจากแบบรายการที่ใช้เป็นคู่สัญญา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ความมั่นคงแข็งแรง ความสวยงามและความเหมาะสมอื่น ตามเจตนารมณ์ของสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ
จัดทำรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นไม่ถือว่าการเพิ่มลดเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ปริมาณงานก่อสร้างแต่อย่าง
ใดทั้งสิ้น แต่เป็นการกำหนดรายละเอียดให้งานก่อสร้างสมบูรณ์ขึ้น ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มลดเนื้องาน
หรือคุณภาพของวัสดุที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ก่อนขออนุญาตแก้ไขตามระเบียบของทางราชการและต้องได้รับอนุมัติ
ก่อนถึงจะดำเนินการได้, LTD. ๑๒/๒๕๖๑

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ในแบบและรายการก่อสร้างนี้ได้มี “ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หรือได้รับ “การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม” แล้วให้ยกเลิกรายการวัสดุและอุปกรณ์นั้น และให้ใช้ตามรายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือรายการผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ให้ถือรายการที่กำหนดในบัญชีคู่มือผู้ซื้อและใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นถึงเดือนที่จะประกาศแจ้งความขายแบบ

4 การทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง

ตรวจแล้ว

โดยผู้ว่าจ้างหรือผู้ให้บริการนั้น ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องค่าบริการ

นายสิริพงษ์ เกษมสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพิเศษ

รายละเอียดรายการทั่วไป

1 ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าโรงงานชั่วคราว หรือวัสดุก่อสร้างหรือการจ่อรถยนต์ผู้รับจ้างจะไม่กระทำให้เกิดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะที่ผ่านไปมา และเมื่อเลิกงานแล้วผู้รับจ้างจะต้องเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ อุปกรณ์การก่อสร้างไว้ภายในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น

2 ระหว่างการก่อสร้างนั้นยังไม้ปิดถนน ตรอก ซอย ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษาซ่อมแซม ตรอก ซอยในบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเดิม

3 ผู้รับจ้างจะต้องหาทางป้องกันมิให้ดินทราย หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ตกลงในบ่อหรือท่อระบายน้ำเป็นอันขาด และถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการตักวัสดุดังกล่าวขึ้นจากบ่อพักหรือท่อระบายน้ำให้หมดสิ้นโดยไม่ชักช้า

4 การขุดร่อนดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจทำให้ถนนหรือทางเท้าทรุดนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำกำแพงกันดินชั่วคราว เพื่อป้องกันการทรุดและดินที่ขุดขึ้นมาต้องไม่กองรูกกล้าผิวจราจรในกรณีที่ไม่มีสถานที่กอง ให้ผู้รับจ้างรับจัดการขนย้ายไปทันที

5 การขุดร่อนดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ผู้รับจ้างต้องขุดเป็นระยะทางยาวพอสมควรให้สัมพันธ์กับการดำเนินการขั้นต่อไป ห้ามผู้รับจ้างขุดร่อนดินยาวเกินความจำเป็น และการขุดผ่านทางแยกหรือทางเข้าบ้านผู้รับจ้างต้องจัดหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุอื่นใดปูรองที่ขุดให้รถยนต์ผ่านได้ หากผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุใดมาปูได้ภายใน 6 ชั่วโมง นับแต่เริ่มขุดและไม่มีการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการกลบหลุมร่อนดินนั้นเสียก่อน สำหรับท่อที่นำมาใช้ผู้รับจ้างวางเรียงให้ได้แนวไม่เกะกะกีดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะ

ในกรณีที่ต้องต่อท่อระบายน้ำจากอาคารของประชาชนเชื่อมกับท่อระบายน้ำที่สร้างใหม่ผู้รับจ้างต้องจัดทำที่เรียบรอย และต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่เจ้าของอาคารในการระบายน้ำประจำวันด้วย

รายการสัญญา

เลขที่ 12/2561 วันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง


VANTAGE
ASSET CO., LTD.

7 การซ่อมบูรณะทางเท้าเดิมที่ชำรุด เศษวัสดุที่รื้อถอนออก ห้ามผู้รับจ้างกองไว้เป็นการกีดขวางการสัญจร หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ผู้รับจ้างต้องจัดการขนย้ายไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างทันที สำหรับวัสดุก่อสร้างบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ทราย ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้อาศัยวางบนทางเท้าได้ แต่ผู้รับจ้างต้องจัดทำคอกใส่โดยไม่กีดขวางการสัญจรไปมา

8 โรงงานชั่วคราวและเศษวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องรื้อถอนขนย้ายให้หมดสิ้นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน หรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้สิทธิ์ผู้ว่าจ้างที่จะรื้อถอนขนย้ายเอง โดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการเข้าดำเนินการจากผู้รับจ้างได้ทั้งสิ้น

กำหนดทำงานแล้วเสร็จ

รายการงานปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ตามแบบและรายการ เลขที่ 12/2561 กำหนดทำงานแล้วเสร็จ 90 วัน



(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____

ตรวจแล้ว

ผู้ว่าจ้าง
เจ้าพนักงานเทศกิจ
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
ผู้รับจ้าง

พยาน


พยาน

พยานและผู้พิมพ์

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ผู้กำหนดรายการ

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการฯ



สำรวจและเขียนแบบ

2

สถาปนิก

วิศวะกร

รักษาที่สาธารณะ

หัวงานโครงการ ฯ

หัวหน้าฝ่ายไทย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ๓

ผู้ช่วยนายแพทย์

แบบแปลน

ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ

பு

โรงเรียนวัดสำราญ

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

มาตฐาน



ผังบริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณ

ตรวจแล้ว

(นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ)
เจ้าพนักงานเวชกิจรับราชการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายเภสัช สำนักงานเขตคลองเตย

รายการสัญญา

เลขที่ 12/2561 วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑


ลาชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

๑๓๖๐.....คิม นพคุณ.....ผู้รับจ้าง

.....พยาน

ชื่อ..... ธน พยาน


.....พยานและผู้พิมพ์

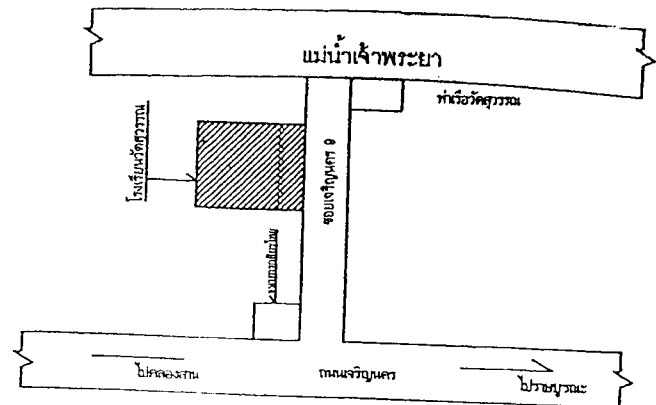

แผนที่ส่งเขไปโรงเรียนวัดสุวรรณ

ឧបករណ៍

อุบลราชธานี

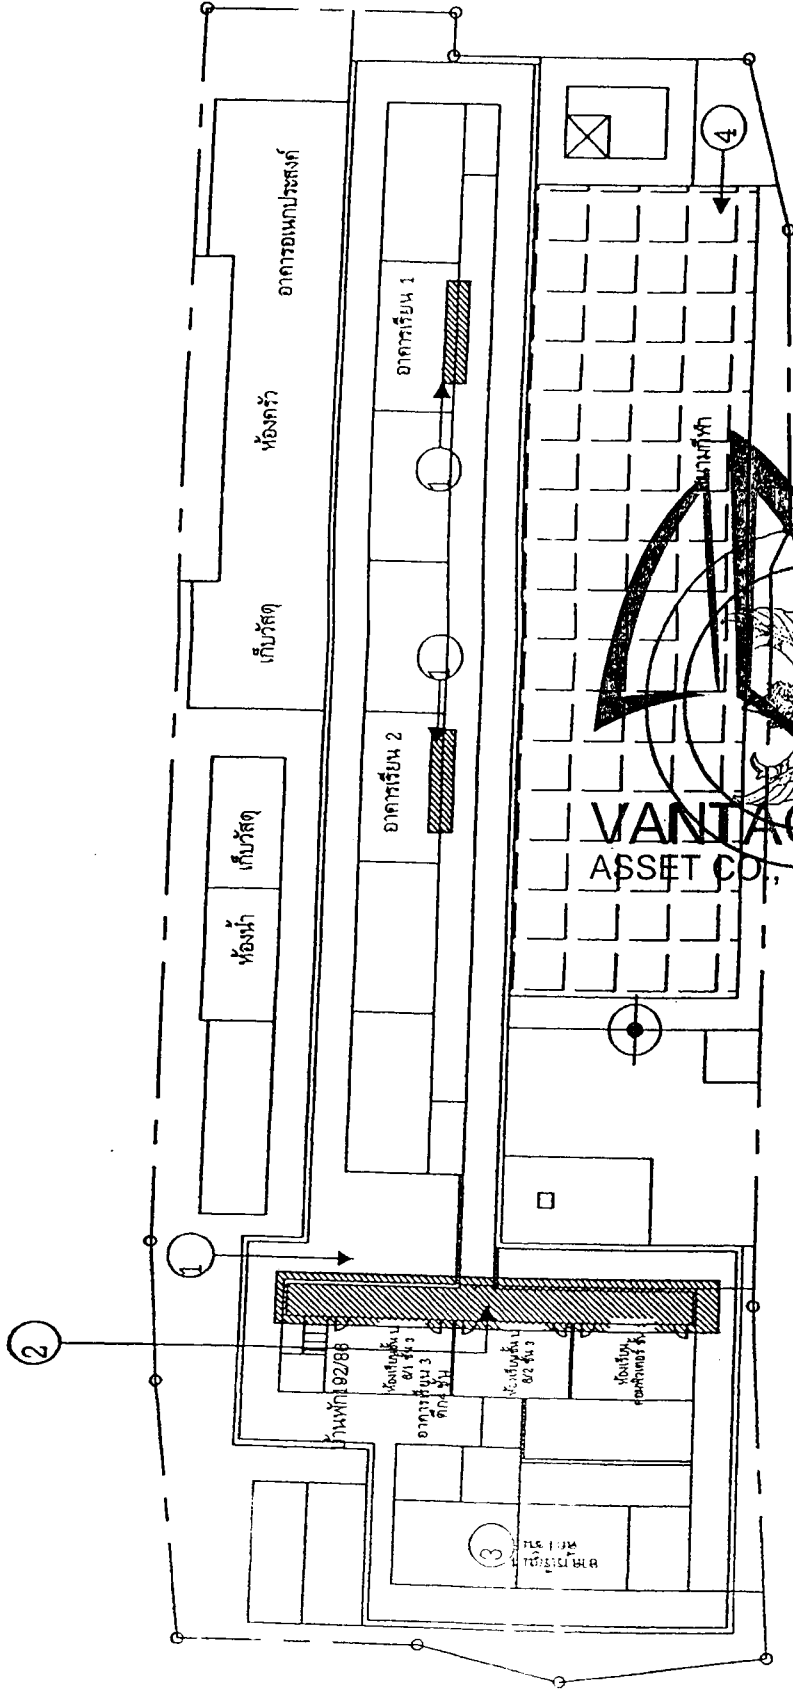

ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ

- 1 ติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลสอาคาร 1 อาคาร 2 ตามแบบ ขส. 12 / 2561
 - ติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลส เกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 4 ชุด
 - งานเดินท่อน้ำดี 24 ชุด
 - ติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างภาชนะ 24 ชุด
 - สร้างท่อรับน้ำฝนสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นิ้วยาวประมาณ 35 ม.
- 2 ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบ ขส. 12 / 2561
 - ติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดมีแป้นตัว เนื้อที่ประมาณ 46 ตร.ม.
 - สร้างรางระบายน้ำสแตนเลสหนา 1 มม. ขนาด 6 นิ้วยาว ประมาณ 29 ม.
 - สร้างท่อรับน้ำฝนสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นิ้วยาวประมาณ 25 ม.
- 3 ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ตามแบบ ขส. 12 / 2561
 - หัสนั้รับน้ำฝน ขนาด ก. 0.60 x ย. 0.60 x ส. 3.50 ม. (1 ชุด)
- 4 ปรับปรุงพื้นสนามโรงเรียน ตามแบบ ขส. 12 / 2561
 - รื้อพื้นเดิมทิ้ง พร้อมปูพื้นยางสังเคราะห์เรซินฮาร์ดคอร์ท สุนทรน้ำ

ตรวจแล้ว

นายวิชาญ วิชาญ
เจ้าพนักงานช่าง
ชำนาญงาน

รายการสัญญา

12/2561 วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
พยาน
พยาน

VANAGE
ASSET CO., LTD.

สำนักงานเขตคลองสาน
สำรวจและเขียนแบบ
สถาปนิก
วิศวกร
รักษาที่สาธารณะ
หัวหน้างานโครงการ ฯ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฯ
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
แบบแสดง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ
สถานที่
โรงเรียนวัดสุวรรณ
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
มาตราส่วน



สำนักงานเขตคลองสาม

สำรวจและเขียนแบบ

สถาปนิก

วิศวกร

รักษาที่สาธารณะ

หัวหน้างานโครงการ

หัวหน้าฝ่ายโยธา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

ผู้อำนวยการเขตคลองสาม

แบบแสดง

ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ

สถานที่

ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ


เขตคลองสาม กรุงเทพฯ

มาตรฐาน

แบบเลขที่ ขคส.12/2561

แผ่นที่ 3

รวม 7 แผ่น

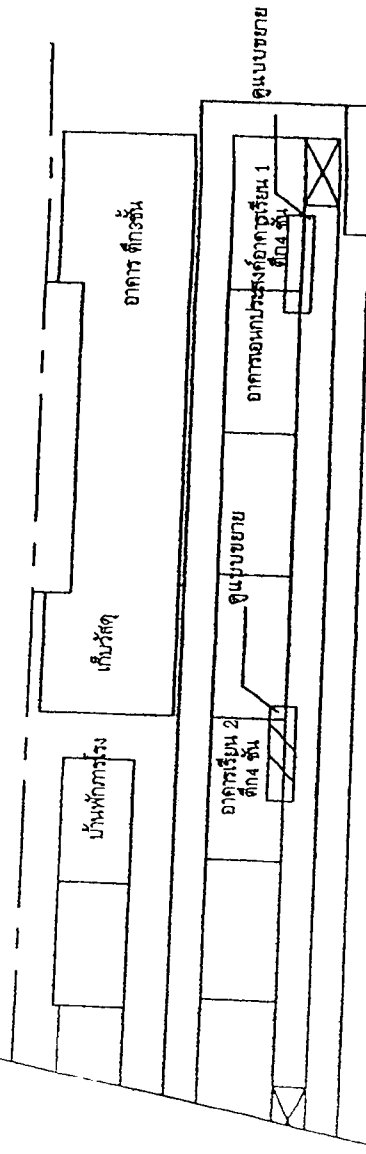

รายการสัญญา

เลขที่ 12/2561 วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยานและผู้พิมพ์


๓๖๕

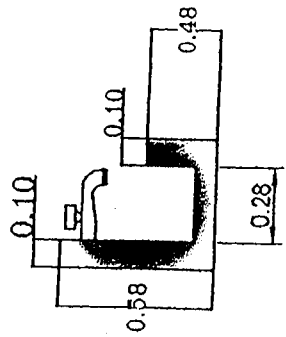

รูปตัด 1

ตรวจสอบแล้ว

นายวิจิตร ภูมิเศรษฐ์
ผู้อำนวยการเขตคลองสาม
จังหวัดนครราชสีมา


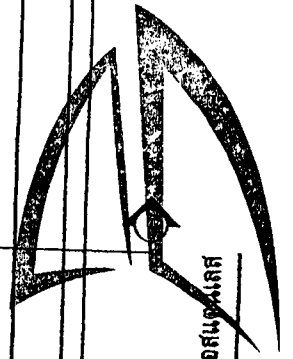


VANTAGE
ASSET CO., LTD.

แบบขยายรูปด้านหน้าอาคารเรียน ๑



สำนักงานเขตคลองสาน
สำรวจและเขียนแบบ
สถาปนิก
วิศวกร
รักษาที่สาธารณะ
หัวหน้างานโครงการ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
แบบแสดง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ
สถานที่
โรงเรียนวัดสุวรรณ
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
มาตรฐาน
แบบเลขที่ เขต 12/2561
แผ่นที่ 5 รวม 7 แผ่น

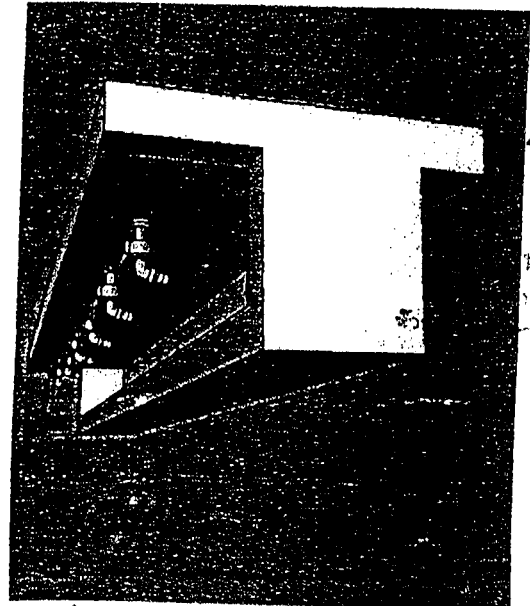

ตรวจแล้ว
 พงษ์ เกษมทรัพย์
 12/2561

รายการสัญญา


12/2561วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑
 ผู้ว่าจ้าง

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑
 ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑



แบบขยายอย่างล้างมือสแตนเลส

VANTA
 ASSET CO.,



สำนักงานเขตคลองสาน

สำรวจและเขียนแบบ

AS

สถาปนิก

วิศวกร

รักษาที่สาธารณะ

On

หัวหน้างานโครงการ

On

หัวหน้าฝ่ายโยธา

SM

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

OT

แบบแสดง

ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ

สถานที่

ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ


เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

มาตราส่วน

แบบเลขที่ ขดส. ๒๔๖๖๕๕๖

แผ่นที่ 4

รวม 7 แผ่น

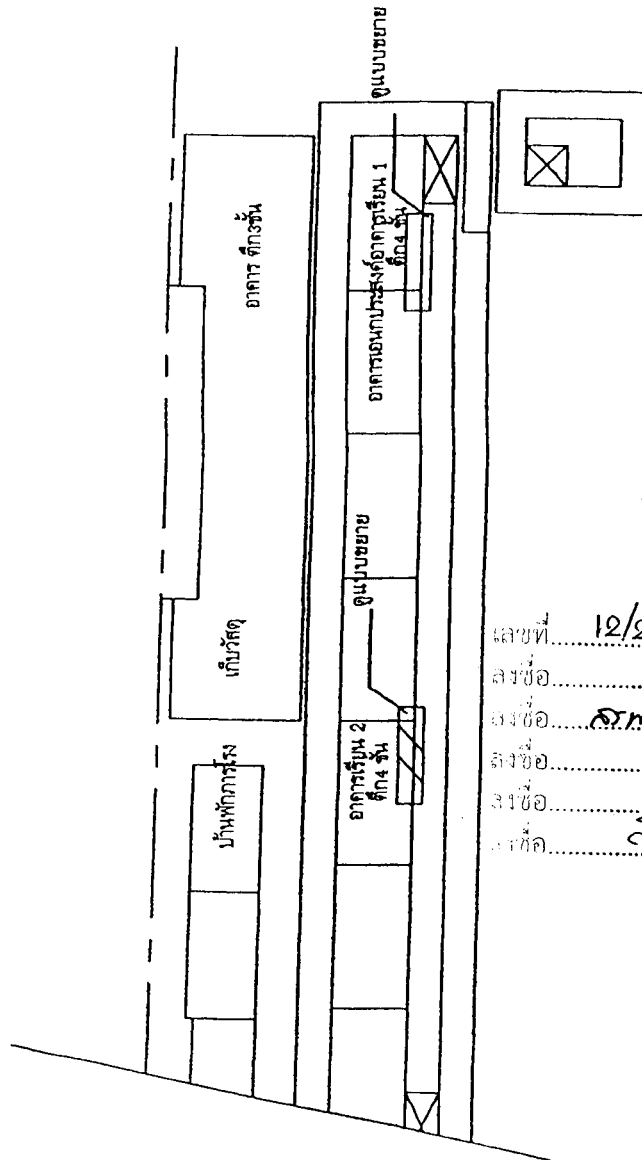


PIB 30


(นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ)
เจ้าพนักงานควบคุมรักษาความปลอดภัย
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน

รายการสัญญา

เลขที่ 12/2561 วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ **ส.พล. พงศธรณ์ วัฒน** ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ **ส.ท.** พยาน
ลงชื่อ **ส.ท.** พยาน
ลงชื่อ **ว.อ.** พยานและผู้พิจารณา



VANTAGE
ASSET CO., LTD.



สำรวจและเขียนแบบ

ສດາປນິກ

วิศกร

รักษาที่สาธารณะ

หัวหน้างานโครงการ ฯ

หัวหน้าฝ่ายโยธา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฯ

[illegible]

แบบแสดง

ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ

๕. ๕๖๖


โรงเรียนวัดสุวรรณ

ชตคณสถาน กรุงเพทฯ


4762

แบบเลขที่ ขคส. 12/2581

พิกัด. นก	๑ - นก
-----------	--------

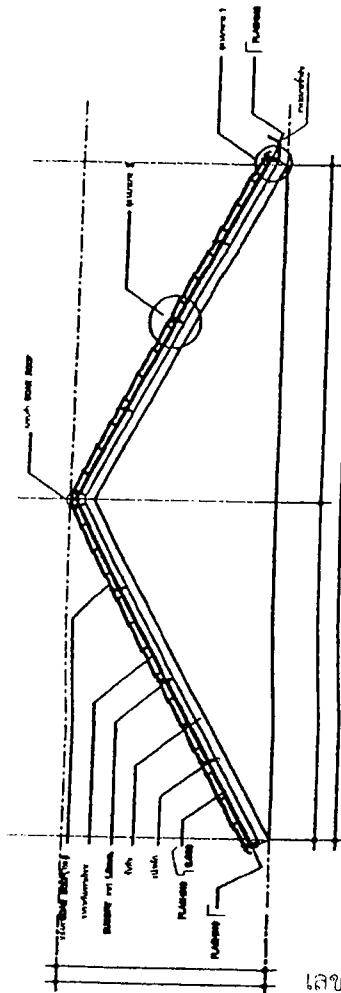


SECTION

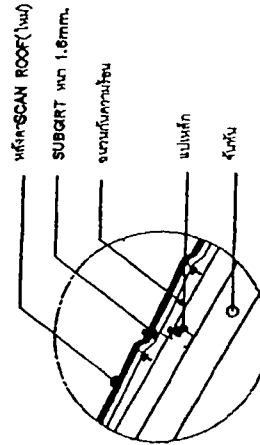

2. ឧបសគ្គ ២

ตรวจแล้ว

เปลี่ยนชื่อย่อจาก SANGKHO
เป็น SANGKHO

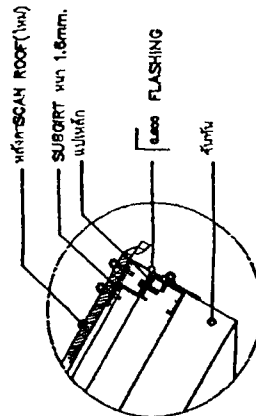

DETAIL

1

รายการสัญญา

เลขที่ 12/2561 วันที่ ๑๙ มิ.ค. ๒๕๖๑


ลงชื่อ.....

ลงชื่อ..... สมาน มงคลผล


ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... พยานและผู้พิพากษา

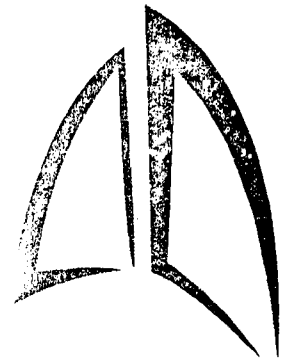


VANTAGE
ASSET CO., LTD.

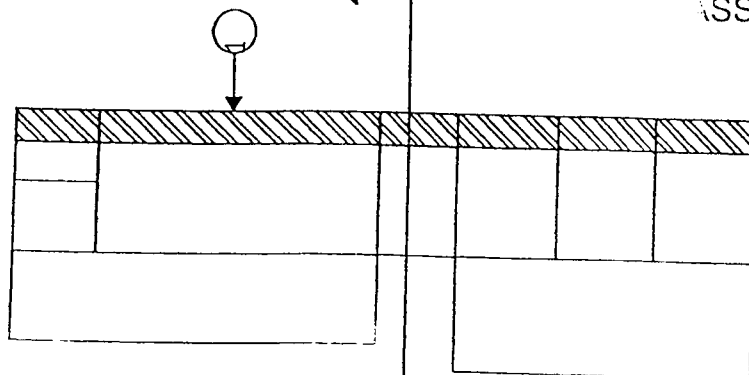[illegible]

อาคารเรียน 4
ตึก 4 ชั้น

1

6.00



5.70

รูปตัด A
SCALE 1/100


รายการสัญญา
เลขที่ 12/2561 วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยานและผู้พิมพ์

ตรวจแล้ว

(นายศิริพงษ์) เกษมทรัพย์
เจ้าพนักงานเทคนิค
สำนักงานวิศวกรรมโยธา

①
- จัดทำ drawings ด้านหน้าเป็นกระดานเลื่อน
- โครงไม้เนื้อแข็ง ปิดทับด้วยไม้ลามิเนต สีและลวดลายกำหนดภายหลัง
อุปกรณ์งานพื้น-ราฟาเกอรี่เทียบเท่า (เสนอรายละเอียด)
หมายเหตุ : รายละเอียดและราคาปรับเปลี่ยนตามสถานที่ปรับปรุง

VANTAG
ASSET CO., LT



สำนักงานเขตคลองสาน
สำรวจและเขียนแบบ
สถาปนิก
วิศวกร
รักษาที่สาธารณะ
หัวหน้างานโครงการ ฯ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
แบบแสดง
ปรับปรุง วิศวกรรมโยธา
โรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตคลองสาน
มาตรฐาน

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. ข้าพเจ้า บริษัท แวนเทจ แอสเสท จำกัด เลขที่ ๔๕ ตรอก/ซอย ซอยพุทธบูชา ๔ ถนน พุทธบูชา แขวง บางมด เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๙๒๓๐๕๕๕ โดยนายสรพล พุกษ์พงษ์รัตน์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๖/๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคาดังนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๙,๔๙๘.๐๑ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ สำนักงานเขตคลองสาน อาจรับคำเสนอ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ สำนักงานเขตคลองสาน ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง (นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ)

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ


สำนักงานเขตคลองสาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ สำนักงานเขตคลองสาน ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาดังนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ สำนักงานเขตคลองสาน ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่สำนักงานเขตคลองสาน และ สำนักงานเขตคลองสาน มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือสำนักงานเขตคลองสาน อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สำนักงานเขตคลองสาน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้



VANTAGE
ASSET CO., LTD.

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ไต่ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า สำนักงานเขตคลองสาน ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น
๙. ใบเสนอราคานี้ไต่ยื่นเสนอโดยบริษัทอียูทีอีเอ็ม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ไต่ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน.

เสนอมา ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสรพล พฤกษ์พงศ์รัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6103160004945

รหัสอ้างอิง OTP DIZC

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๕๐๘๘๘๔๑

.....กรรมการพิจารณาผล
.....กรรมการพิจารณาผล
.....กรรมการพิจารณาผล

รายการสัญญา

เลขที่ 12/2561 วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง


ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ตรวจสอบแล้ว


.....

นายวิวัฒน์.....
เจ้าหน้าที่.....
หัวหน้าฝ่าย.....

.....



VANTAGE
ASSET CO., LTD.



VANTAGE
ASSET CO., LTD.

ใบเสนอราคา
(ใบแจ้งปริมาณงาน)

ข้าพเจ้า บริษัท แวนเทจ แอสเสท จำกัด

โดย นายสรพล พุ่มพวงศรีรัตน์

(เป็นกรรมการผู้จัดการ, หัวหน้าผู้จัดการ, ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 45 ซอยพุทธบูชา 4 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ 081-923-0595

หมายเลขทะเบียนการค้า 0105555088841

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงินทั้งสิ้น
	ขอเสนอราคาคำเนินการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ				
1	ปรับปรุงอาคารอาคาร 1 และ 2 ตามแบบ ขคส.12/2561				
	- ติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	4	ชุด	21,681.31	86,725.24
	- งานเดินท่อน้ำดี (เฉลี่ยต่อจุด)	24	จุด	783.00	18,792.00
	- ติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างภาชนะ	24	ชุด	189.18	4,540.32
	- สร้างท่อรับน้ำฝนสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว				
	ยาวประมาณ	12	ม.	678.44	8,141.28
2	ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบ ขคส.12/2561				
	- ติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดมีแป้นในตัว เนื้อที่ประมาณ	46	ตร.ม.	1,450.82	66,737.72
	- สร้างรางระบายน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. ขนาด 6 นิ้ว ยาวประมาณ	29	ม.	1,102.47	31,971.63
	- สร้างท่อรับน้ำฝนสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว				
	ยาวประมาณ	24	ม.	678.44	16,282.56
3	ปรับปรุงห้องดนตรีไทย ตามแบบ ขคส.12/2561				
	- ติดตั้งตู้บิวีน ขนาด ก.0.60 x ย.6.00 x ส. 3.50 ม. (1 ชุด) ยาวประมาณ	6	ม.	19,491.00	116,946.00
4	ปรับปรุงพื้นสนามโรงเรียน				
	- รื้อพื้นเดิมทิ้ง พร้อมปูพื้นยางสังเคราะห์ชนิดซูเปอร์เรจินฮาร์ดคอร์ท				
	สูตรน้ำ หนาเฉลี่ย 2 มม. พื้นที่ประมาณ	601	ตร.ม.	913.25	548,863.25
					899,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.....899,000.00.....)				
	โดยแยกเป็นค่าต้นทุน (.....840,186.92.....)				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (.....58,813.08.....)				
	กำหนดส่งมอบงานภายใน.....90.....วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาฉบับนี้ไปเป็น				

เลขที่.....12/2561.....วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

VANTAGE
ASSET CO., LTD.

(ลงชื่อ).....
(.....)
ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

VANTAGE
ASSET CO., LTD.

