



สัญญาเลขที่....14/ 2561....

สัญญาจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเขตคลองสาน แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่.....27..... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2561..... ระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดย.....นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์.....ตำแหน่ง...ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร...ทำการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยรับมอบอำนาจตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2718/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิรัชก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่....32/132...หมู่ที่...-...ซอย....ศิลปเดช.....ถนน.....จอมทอง.....ตำบล / แขวง.....บางค้อ.....อำเภอ / เขต.....จอมทอง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... โดย.....นายวิชัย โสภณถาวรกุล..... เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกรุงเทพมหานคร เลขที่.....100922034457.....ลงวันที่...27...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ...2561... และหนังสือมอบ อำนาจ ลงวันที่.....-.....เดือน...-.....พ.ศ. ...-.....แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน.....ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ..... ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา.....

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 458,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน).....

ณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

รายการสัญญา

เลขที่ 14/2561 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

/2. ...

 **ISVC** **สำนักงานส่วนจำกัด ส.วิรัชก่อสร้าง**
SIRIRATCHAKORN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 2.1 | ผนวก 1 แบบรูป..แบบเลขที่ ขคส. 7/2561 | จำนวน...3....แผ่น |
| 2.2 | ผนวก 2 รายละเอียด.....รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ | |
| | รายการเลขที่ ขคส. 7/2561..... | จำนวน...5....แผ่น |
| 2.3 | ผนวก 3 ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน...1...หน้า |
| 2.4 | ผนวก 4 ใบเสนอราคา | จำนวน...3...หน้า |
| 2.5 | ผนวก 5 รายการมาตรฐานงานอาคารของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 | จำนวน....1...เล่ม |
| 2.6 | ผนวก 6 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา | |
| | | จำนวน...5...หน้า |
| 2.7 | ผนวก 7 รายละเอียดรายการทั่วไปแนบท้ายสัญญาจ้าง | จำนวน...2...หน้า |
| 2.8 | ผนวก 8 รายละเอียดแนบท้ายสัญญา | จำนวน...1...หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น...หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน).....สาขา.....บางขุนเทียน.....เลขที่.....100017222419.....ลงวันที่.....21.....เดือน.....มีนาคม... พ.ศ. ...2561... เป็นจำนวนเงิน.....22,900.-.....บาท (...สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ...5.....(ห้า).... ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน7.....(เจ็ด).... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

รายการสัญญา
เลขที่ 14/2561 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
.....ผู้รับจ้าง
SVC ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วีระชัยก่อสร้าง
S.VEERACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

ข้อ 4 (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....458,000.-.....บาท
(....สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....29,962.62.....บาท ตลอดจนภาษีอากร
อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ใน
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 3

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบ
แจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้
ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกหรือหักค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวน
ปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

4.1 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้
ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

4.2 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน
ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคา
ต่อหน่วยตามสัญญา

4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนด
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็น
ค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่าง
ระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของรายการนั้นตามสัญญา โดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วยราคา
ต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า OVERHEAD และ MOBILIZATION ดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง
จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

4.4 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น ตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของ
การจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณา
เห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มี
ผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้น ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดย
เด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อผู้ว่าจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนด
แห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้เสร็จสมบูรณ์ทุกประการ รวมทั้งการ
ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20


การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเช็คสั่งจ่าย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....กรุงเทพ จำกัด (มหาชน).....สาขา.....ถนนราชจักร.....เลขที่บัญชี.....121-3-100397.....
หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงธนาคารและเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนมีการเบิกจ่ายเงินด้วย

รายการสัญญา

เลขที่.....14/2561 วันที่.....ม.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

 SVEERACHA CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

ข้อ 4 (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน.....บาท
(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท

ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน
เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1. เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....

ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ 2. เป็นจำนวนเงิน.....บาท(.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....

ให้แล้วเสร็จภายใน.....

..... ฯลฯ.....

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเช็คสั่งจ่าย เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....
หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงธนาคารและเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนมีการเบิกจ่ายเงินด้วย

ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท
(.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตาม
เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น
หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะ
เรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

รายการสัญญา

/ 5. ...

เลขที่ 14/2561 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
วงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

 ห่วงหุ้นส่วนจำกัด ส.วีชัยก่อสร้าง
S. VESSACHON CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดเชยคืนเงินล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

5.3 (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

5.4 เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

5.6 (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตาม 5.3 (ก)

5.6 (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 (ข)

ข้อ 6 การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....บาท (.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ / หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

รายการสัญญา

เลขที่ 14/2561 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

/6. ...

ข้อ 7 (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ
แผนงานให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลัก
ต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้เริ่มงานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งดังกล่าวนี้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
ตามสัญญา

ข้อ 7 (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....28.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.2561.....
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....26....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.2561.....(.....60.....วัน)
(นับถัดจากวันลงนามสัญญา) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะ
แล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือ
บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างราย
ใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายใน
กำหนด.....2....(....สอง....) ปี.....(.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง
หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือ
ทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้าง
ไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด....15...(สิบห้า)....วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

รายการสัญญา

เลขที่ 14/2561 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

ISVC ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อัครวิทย์ก่อสร้าง
S. OAKLEY & CO. CONST. CO. LIMITED PARTNERSHIP

17. ...

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 12 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 13 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ 14 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 15 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

รายการสัญญา

/9. ...

เลขที่ 14/2561 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

 ส. วิชัยกุล
S. VITHAYAKUL
S. VITHAYAKUL

ข้อ 16 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะส่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสาร
สัญญาฯ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ 17 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ....458-....บาท (...สี่ร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน...) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินละ.....-.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 18 สิทธิของผู้จ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 19 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

รายการสัญญา

/10. ...

លេខ: 14/2561 រ៉ាប់ ២៧ ឆ្នាំ ២៥៦១

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

Svc ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วีรชัยก่อสร้าง
S.WEEERACHA. CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 20 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 21 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 22 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (BILL OF LADING) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

รายการสัญญา

เลขที่.....14/2561.....วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วีระชัยก่อสร้าง
SVEERACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

/11. ...

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใดดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 23 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันที่กระทรวงแรงงานรับรอง.....หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ...10.....ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวน อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- 23.1 ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง (ตามวุฒิ) ช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างสี และอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

กรณีเป็นงานจ้างที่มีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า กรุงเทพมหานครจะพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้เมื่อผู้ชนะการประกวดราคาได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ เรียบร้อยแล้ว

1. ปลุกสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวมีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมที่จะเข้าทำงานได้
2. จัดเตรียมสิ่งป้องกันมลภาวะที่เหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอ
3. จัดทำและติดตั้งป้ายประกาศและป้ายแนะนำในการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างป้ายเตือน เครื่องหมายและสัญญาณต่าง ๆ ต้องมีเพียงพอและมีสำรองอีก 1 ชุด เพื่อใช้ในการป้องกันอันตราย ทั้งกลางวันและกลางคืน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....นายวิชัย โสภณถาวรกุล.....) **SVC** ท่าอากาศยานจำกัด a.วิรัชก่อสร้าง
S VEERACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นายพัฒนิก สาดราภัย.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นายชนาสิน ชัยอักษรเวช.....)

(ลงชื่อ).....พยานและผู้พิมพ์
(.....นางสาวสุกัญญา กัณหะลา.....)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทรวมถึง งานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายใน ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างาน จากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนี ราคาซึ่งจัดหาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การทำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่นใน ประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่มิมีงานก่อสร้างหลายประเภทงานจ้างคราวเดียวกันจะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละ ประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้
4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง เรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิที่จะต้องเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืน จากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว และให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หัก เงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี
5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณา วินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคา ค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) + (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาทำงานต่อหน่วยหรือราคาทำงานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาทำงานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาทำงานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน สัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกเงินค่างานคืน

ตรวจสอบแล้ว

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

รายการสัญญา

เลขที่ 14/2561 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วีระชัยก่อสร้าง
S VEERACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

1. งานอาคาร

1. งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยินเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้า สำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ IT/IO} + 0.10 \text{ CT/CO} + 0.40 \text{ MT/MO} + 0.10 \text{ ST/SO}$

2. งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชื่อน คลอง ดินคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล ปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ IT/IO} + 0.40 \text{ ET/EO} + 0.20 \text{ FT/FO}$

3. งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 \text{ AT/AO} + 0.20 \text{ ET/EO} + 0.10 \text{ FT/FO}$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ MT/MO} + 0.30 \text{ AT/AO} + 0.20 \text{ ET/EO} + 0.10 \text{ FT/FO}$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ MT/MO} + 0.40 \text{ AT/AO} + 0.10 \text{ ET/EO} + 0.10 \text{ FT/FO}$

รายการสัญญา

เลขที่ 1A/2561 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

IS ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิชัยก่อสร้าง
S. VICHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWET BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ IT / IO} + 0.35 \text{ CT / CO} + 0.10 \text{ NT / MO} + 0.15 \text{ ST / SO}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กงาน ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดสะพานรวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ IT / IO} + 0.15 \text{ CT / CO} + 0.15 \text{ MT / MO} + 0.15 \text{ ST / SO}$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ IT / IO} + 0.15 \text{ CT / CO} + 0.20 \text{ MT / MO} + 0.25 \text{ ST / SO}$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุเสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย **ตรวจสอบแล้ว**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 \text{ IT / IO} + 0.05 \text{ CT / CO} + 0.20 \text{ MT / MO} + 0.40 \text{ ST / SO}$$

รายการสัญญา

เลขที่ 14/2561 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

(นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ)

วิศวกรโยธา จังหวัดนนทบุรี

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

SVC ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วีระชัยก่อสร้าง
S VEERACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
IT	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
IO	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
CT	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
CO	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
MT	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
MO	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ST	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
SO	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GT	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GO	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
AT	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
AO	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ET	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
EO	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
FT	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
FO	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ACT	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACO	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCT	=	ดัชนีราคาท่อ พีวีซี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCO	=	ดัชนีราคาท่อ พีวีซี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GPT	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPO	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PET	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEO	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
WT	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
WO	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ปรับปรุงแก้ไข

นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ
เจ้าพนักงานวิชาชีพชั้น ๓ สาขาการบัญชี
กองกลางการเงิน สำนักงาน ก.พ.ร.

รายการสัญญา

เลขที่ 14/2561 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

 ทำแทนส่วนจำกัด ส.วรชัยก่อสร้าง
S. WERESHA CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

ก. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มียางก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนด ให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่าตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของประกวดราคา มากกว่า 4 % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4 % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4 % แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างาน ให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนี ราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

ตรวจแล้ว

(นายศิริพงษ์ โกษมสุวรรณ

เจ้าพนักงานบัญชีอาวุโส - การพิเศษ

รับผิดชอบงาน ผู้รับจ้างแบบปรับราคา

รายการสัญญา

วันที่ 14/2561

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑

ISvc

เกวทีเอสว จำกัด ส.วิชัยก่อสร้าง
S.VICHAY CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

รายละเอียดแนบท้ายสัญญางานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขคส.7-1/2561

1.1 ปรับปรุงโรงอาหาร

- รื้อพร้อมติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี บุนนวกันความร้อน หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
พื้นที่ประมาณ 137 ตร.ม.

ราคา ตร.ม. ละ 1,253.- บาท เป็นเงิน 171,661.- บาท

1.2 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

- รื้อพร้อมติดตั้งพื้นไม้เนื้อแข็งวางบนตงไม้เนื้อแข็ง พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.

ราคา ตร.ม. ละ 1,959.- บาท เป็นเงิน 43,098.- บาท

- รื้อพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงโครงเหล็กชุบ สังกะสี
พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม.

ราคา ตร.ม. ละ 499.- บาท เป็นเงิน 34,930.- บาท

2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขคส.7-2/2561

- รื้อพร้อมติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.
พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.

ราคา ตร.ม. ละ 555.- บาท เป็นเงิน 30,525.- บาท

- สร้างพื้น EPDM หนาเฉลี่ย 10-14 มม. พร้อมทำพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม.
พื้นที่ประมาณ 76 ตร.ม.

ราคา ตร.ม. ละ 2,300.- บาท เป็นเงิน 174,800.- บาท

- รื้อพร้อมติดตั้งหลังคากระเบื้อง พื้นที่ประมาณ 2 ตร.ม.

ราคา ตร.ม. ละ 305.- บาท เป็นเงิน 610.- บาท

- รื้อพร้อมติดตั้งฝ้ายิบซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. พื้นที่ประมาณ 2 ตร.ม.

ราคา ตร.ม. ละ 1,084.- บาท เป็นเงิน 2,168.- บาท

- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% พื้นที่ประมาณ 2 ตร.ม.

ราคา ตร.ม. ละ 104.- บาท เป็นเงิน 208.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 458,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รายการสัญญา

เลขที่ 14/2561 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

 แก้วกันสวนจำกัด ส.วิชัยก่อสร้าง
S. VITHAYAKORN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

รายละเอียดรายการทั่วไปแนบท้ายสัญญาจ้าง

(1) ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าในการก่อสร้างจะไม่กระทำการใด ๆ ให้เป็นการกีดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะที่ผ่านไปมาและเมื่อเลิกงานแล้วก็จะเก็บยานพาหนะและอุปกรณ์การก่อสร้างไว้ภายในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น

(2) หากมิได้รับอนุญาตให้ปิดการจราจรในถนน ตรอก ซอย ที่ทำการก่อสร้างหรือปรับปรุงผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ให้สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ

(3) ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้ดิน ทราบ หิน หรือวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ตกลงในบ่อพักหรือท่อระบายน้ำเป็นอันตราย และถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ต้องนำวัสดุดังกล่าวขึ้นจากบ่อพักหรือท่อระบายน้ำให้หมดสิ้นโดยไม่ชักช้า

(4) การขุดดินเพื่อวางท่อระบายน้ำซึ่งอาจทำให้ถนนหรือทางเท้าชำรุด ผู้รับจ้างต้องจัดทำกำแพงกันดินชั่วคราวเพื่อป้องกันการทรุดและดินที่ขุดขึ้นมาต้องไม่กองรูก่ลาผิวจราจรในกรณีที่ไม่มีสถานที่กอง ให้ผู้รับจ้างขนย้ายไปทันที

(5) การขุดร่องดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ผู้รับจ้างต้องขุดเป็นระยะทางให้สัมพันธ์กับความสามารถในการวางท่อระบายน้ำลงในร่องดินห้ามมิให้ผู้รับจ้างขุดร่องดินยาวเกินความจำเป็นและการขุดผ่านทางแยกหรือทางเข้าบ้าน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุอื่นใดปูทับร่องที่ขุดเพื่อให้ยานพาหนะสามารถผ่านได้ หากผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุใดปูได้ภายใน 6 ชม. นับแต่วันเริ่มขุดและไม่มีการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการหลบหลุมร่องดินเสียก่อน ส่วนท่อระบายน้ำที่นำมาใช้ผู้รับจ้างวางเรียงให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะ

(6) ในกรณีที่มีการระบายน้ำออกจากอาคารของประชาชน ผู้รับจ้างต้องเชื่อมต่อท่อระบายน้ำของประชาชนเข้ากับท่อระบายน้ำที่สร้างขึ้นใหม่ โดยจัดทำให้เรียบร้อยและไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่เจ้าของอาคารในการระบายน้ำประจำวันด้วย

(7) การซ่อมแซมบูรณะทางเท้าที่ชำรุดเศษวัสดุที่รื้อถอนอาคารหากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ผู้รับจ้างต้องขนย้ายไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างทันที กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ให้กองได้โดยไม่กีดขวางการสัญจรส่วนวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้เช่น หิน ทราบ ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้กองบนทางเท้าได้แต่ผู้รับจ้างต้องจัดทำคอกกันโดยไม่กีดขวางการสัญจรไปมา

(8) ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนขนย้ายโรงงานชั่วคราวและวัสดุก่อสร้างให้หมดสิ้นภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานหรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้ารื้อถอนขนย้ายเองโดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการเข้าดำเนินการจากผู้รับจ้างได้

รายการสัญญา

เลขที่ 14/2561 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วีระชัยก่อสร้าง
S.VEERACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

(9) งานก่อสร้างในส่วนที่เป็นคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ถือว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้มีการบ่มคอนกรีตครบ 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(10) ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์ จะขอต่ออายุสัญญาหรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลแห่งการนั้น พร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยยื่นที่ กองกลางสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(10.1) การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้สั่งจ้างก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาหรืออย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดอายุสัญญา

(10.2) การขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในเวลา ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาต่ออายุสัญญา

การยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาหรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา ที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิในการต่ออายุสัญญา

พร้อมแนบ

รายการสัญญา
เลขที่ 14/2561 ลงวันที่ ๒๓ มิ.ค. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง.....
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง.....
นายศิริพงษ์ เกษมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
SVC
สำนักงานส่วนจำกัด ส.วีเอสซีก่อสร้าง
S VEEACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วีระชัยก่อสร้าง เลขที่ ๓๒/๑๓๒ ตรอก/ซอย ศิลป

เดช ถนน จอมทอง แขวง บางค้อ เขต จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๕๐

โทรศัพท์ ๐๘๖๓๐๖๓๖๐๑ โดย นายวิชัย โสภณถาวรกุล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๘/๒๕๖๑ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่ใช่ผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ สำนักงานเขตคลองสาน อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ สำนักงานเขตคลองสาน ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้

๕. ในการยื่นซองและซองซองข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ สำนักงานเขตคลองสาน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือให้ทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ สำนักงานเขตคลองสาน ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ สำนักงานเขตคลองสาน ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่สำนักงานเขตคลองสาน และ สำนักงานเขตคลองสาน มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือสำนักงานเขตคลองสาน อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สำนักงานเขตคลองสาน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วีระชัยก่อสร้าง
S.VEERACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า สำนักงานเขตคลองสาน ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทวิชัยภูมิธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิชัย โสภณถาวรกุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6103160015927

รหัสอ้างอิง OTP UDWG

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๓๕๓๗๐๒๘๕๒๐

ตรวจแล้ว

นายวิชัย โสภณถาวรกุล

เจ้าพนักงานบัญชี

รายการสัญญา

เลขที่ 14/2561 วันที่ 14/3/2561

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

Svc สำนักงานจำกัด ส.วิชัยก่อสร้าง
S.VEEACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

Svc สำนักงานจำกัด ส.วิชัยก่อสร้าง
S.VEEACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

รายละเอียดแบบท้ายใบเสนอราคา
งานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินค่าของ เครื่องมือช่วย	จำนวนเงินค่าแรง	รวมจำนวนเงิน
1	ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขตส.7-1/2561						
	1.1 ปรับปรุงโรงอาหาร						
	- รื้อพร้อมติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี บดรวมกันความหนา หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พื้นที่ประมาณ	137	ตร.ม.	1,100	150,700	20,961	171,661
	1.2 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์						
	- รื้อพร้อมติดตั้งพื้นไม้เนื้อแข็งวางบนตงไม้เนื้อแข็ง พื้นที่ประมาณ	22	ตร.ม.	1,700	37,400	5,698	43,098
	- รื้อพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.						
	โครงสร้างเหล็กคาน้ำ สังกะสี พื้นที่ประมาณ	70	ตร.ม.	349	24,430	10,500	34,930
2	ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขตส.7-2/2561						
	- รื้อพร้อมติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พื้นที่ประมาณ	55	ตร.ม.	425	23,375	7,150	30,525
	- สร้างพื้น EPDM หนาเฉลี่ย 10-14 มม. พร้อมทำพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. พื้นที่ประมาณ	76	ตร.ม.	2,000	152,000	28,800	174,800
	- รื้อพร้อมติดตั้งหลังคากระเบื้อง พื้นที่ประมาณ	2	ตร.ม.	235	470	140	610
	- รื้อพร้อมติดตั้งฝ้ายิบซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. พื้นที่ประมาณ	2	ตร.ม.	384	768	1,600	2,168
	- ทาสีน้ำอะครีลิค 100% พื้นที่ประมาณ	2	ตร.ม.	72	144	64	208

นาย...
เจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานเทศบาล...
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตคลอง...

รายการสัญญา
14/2561 วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

Sve บริษัท สวีคอนสตรัคชั่น จำกัด
SVE CONSTRUCTION CO., LTD.

ใบเสนอราคา

๘ (ในแจ้งปริมาณงาน)
ส.วิรัชก่อสร้าง

ข้าพเจ้า (บริษัท,ห้าง,ร้าน ผู้เข้าเสนอราคา)

โดย (นาย,นาง,นส.)

จิชัย

โกลิถอนทอเรียล

(เป็นกรรมการผู้จัดการ, หัวหน้าผู้จัดการ, ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 32/132

ร.กีฬาเดช

อ.จอมทอง

บจก.จอมทอง

เลขที่ ๖๖๖/๖๖๖/๖๖๖

โทรศัพท์ 02-468-0319

หมายเลขทะเบียนการค้า

0103537028520

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงินทั้งสิ้น
	ขอเสนอราคาคำเนินการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ				
1	ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขคส.7-1/2561				
	1.1 ปรับปรุงโรงอาหาร				
	- รื้อพร้อมติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี บุนนาคกันความร้อน หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พื้นที่ประมาณ	137	ตร.ม.	1,253	171,661
	1.2 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์				
	- รื้อพร้อมติดตั้งพื้นไม้เนื้อแข็งวางบนตงไม้เนื้อแข็ง พื้นที่ประมาณ	22	ตร.ม.	1,959	43,098
	- รื้อพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบ สังกะสี พื้นที่ประมาณ	70	ตร.ม.	499	34,930
2	ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขคส.7-2/2561				
	- รื้อพร้อมติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พื้นที่ประมาณ	55	ตร.ม.	555	30,525
	- สร้างพื้น EPDM หนาเฉลี่ย 10-14 มม. พร้อมทำพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. พื้นที่ประมาณ	76	ตร.ม.	2,300	174,800
	- รื้อพร้อมติดตั้งหลังคากระเบื้อง พื้นที่ประมาณ	2	ตร.ม.	305	610
	- รื้อพร้อมติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. พื้นที่ประมาณ	2	ตร.ม.	1,084	2,168
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% พื้นที่ประมาณ	2	ตร.ม.	104	208
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนห้าหมื่นแปดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)				458,000
	โดยแยกเป็นค่าต้นทุน (สี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)				428,037.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)				29,962.62
	กำหนดส่งมอบงานรายนี้ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป				

ตรวจแล้ว

(นายศิริพงษ์ วัฒนศิริ)

ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือแล้ว

รายการสัญญา

เลขที่ 14/2561

วันที่

๒๕๖๑

วงชื่อ

วงชื่อ

ผู้ได้รับมอบอำนาจ ส.วิรัชก่อสร้าง

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ส.วิรัชก่อสร้าง

SVEERACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

SVC ผู้ถือหุ้น ส.วิรัชก่อสร้าง
SVEERACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

SVC ผู้ถือหุ้น ส.วิรัชก่อสร้าง
SVEERACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

รายการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ

รายการเลขที่..... ขคส. 7/2561

วัตถุประสงค์

สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงโรงเรียน วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตามแบบและรายการ ดังนี้

1. รายการฉบับนี้เลขที่ ขคส. 7/2561
2. แบบเลขที่ ขคส. 7/2561
3. รายการมาตรฐานงานอาคาร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546

ปริมาณงาน

ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ ตามแบบ ขคส. 7/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขคส. 7-1/2561
- ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ตามแบบ ขคส. 7-2/2561



นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ

เจ้าพนักงานบริหาร จำนวน ๑ คน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตคลองสาน

ข้อกำหนดเฉพาะงาน

1. ในการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง และอุปสรรคต่างๆ หากมีหรือพบอุปสรรคใดๆ จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้ประสานงานและติดต่อแก้ไข ในการนี้ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ผู้รับจ้างจะเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
2. เนื่องจากงานก่อสร้างตามรายการฉบับนี้เป็นงานปรับปรุง ดังนั้นตำแหน่งระยะต่างๆ ที่กำหนดไว้จึงเป็นการกำหนดโดยสังเขป เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ปริมาณงานรวมจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าของเดิม และถือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเนื้องานตาม รายการในสัญญาแต่ประการใด
3. ตำแหน่งที่ตั้งของส่วนที่จะทำการปรับปรุง ให้ถือระยะที่กำหนดในผังบริเวณหรือในกรณีที่ผังบริเวณขัดกับสถานที่ก่อสร้างจริง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องทางหลักวิชาช่าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้กำหนดรายการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในการวางตำแหน่งของส่วนที่จะปรับปรุงดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้เนื้อหาของงานก่อสร้างลดลงหรือค่าก่อสร้างต้องเปลี่ยนแปลงไปจากข้อสัญญา

เลขที่..... 14/2561 วันที่..... ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

4. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดการชำรุดเสียหายจากการดำเนินงานปรับปรุงครั้งนี้ โดยการเปลี่ยนให้ใหม่หรือปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรงและใช้การได้ดีตามสภาพเดิม
5. ในการดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยกับประชาชนที่อยู่ภายในสถานที่ และต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานของผู้รับจ้างเอง
6. ในกรณีที่มีการรื้อวัสดุหรือส่วนใดๆ ของอาคารออกนั้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการจัดเก็บขนย้ายออกไปทิ้ง พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย
7. วัสดุตกแต่งเช่นหินแกรนิต หินอ่อน หรือวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานตกแต่ง ที่มีรูปแบบลวดลายของวัสดุที่แตกต่างกัน ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุตัวอย่างหรือรายละเอียดประกอบเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาคัดเลือกวัสดุ และจะต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ชนิดเดียวกันในการก่อสร้างคราวเดียวกัน ให้ใช้ยี่ห้อเดียวกันเพื่อความกลมกลืน สวยงามและสะดวกในการซ่อมแซม
8. วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์ที่นำมาประกอบและติดตั้งต้องได้มาตรฐาน หรือคุณภาพสูงกว่าหรือเทียบเท่าวัสดุ อุปกรณ์เดิม
9. งานทาสี ต้องมีการเตรียมพื้นผิวในการทาสี ต้องทำความสะอาดให้แห้ง และปราศจากคราบไขก่อนทาสีจริง การทาสีปูนเก่าจะต้องทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 ครั้ง แล้วทาสีทับด้วยสีน้ำพลาสติกอีก 2 หรือ 3 ครั้ง
10. ให้รวมการบรรจุระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา และงานทาสีพื้นที่ส่วนที่ทำการปรับปรุงและส่วนต่อเนื่อง
11. ระดับของส่วนที่จะทำการปรับปรุงจะกำหนดให้ ณ สถานที่ก่อสร้าง

๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑

(นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ)

เจ้าพนักงานช่างเทคนิค ในการพิเศษ

สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

รายการทั่วไป

1. สิ่งกีดขวางต่อการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างจัดการขนย้ายให้เรียบร้อยและผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอกซึ่งต้องเสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง
2. ผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของผู้ใช้เส้นทางนี้ ในระหว่างการก่อสร้างตลอดเวลา
3. เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว ก่อนส่งมอบงานของผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

เลขที่ 14/2561 วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....ผู้ว่าฯ
ลงชื่อ.....ผู้รับ

..../3..

การดำเนินการทั่วไป

1 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

เนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ บางส่วนเป็นการก่อสร้างด้วยฝีมือแรงงาน บางส่วนใช้วัสดุที่ผลิตขึ้น โดยวิธีการอุตสาหกรรม การก่อสร้างจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนไปจากรูปแบบ และรายการได้บ้าง ดังนั้นวัสดุ และฝีมือของสิ่งที่ทำขึ้นในระบบอุตสาหกรรม จึงอนุโลมให้มีการคลาดเคลื่อนได้ตามที่มาตรฐานระบบ อุตสาหกรรมนั้นๆ กำหนดไว้ ตัวอย่าง เช่น ขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีต ยอมให้ใหญ่หรือเล็กกว่าขนาดที่ กำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่าความคลาดเคลื่อนที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงอนุโลมให้มีการคลาดเคลื่อน ได้เช่นกัน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้นี้ ผู้กำหนดรายการเป็นผู้วินิจฉัยให้เป็นเด็ดขาดตามหลักวิชาช่างที่ดี เพื่อให้เกิดผลดีต่อเจตนารมณ์ของการก่อสร้างครั้งนี้ กรณี การก่อสร้างปรับปรุงที่ก่อสร้างเดิมให้ถือขนาดและ ระยะของอาคารเดิมเป็นหลัก ปริมาณงานที่อยู่ในความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับข้างต้นจะไม่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างแต่อย่างใด และจะไม่ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาด้วย

2 แบบรายการ

รูปแบบรายการที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เท่านั้น การก่อสร้างจริงตามหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้องมีแบบรายละเอียดที่จำเป็นต้องจัดทำขณะก่อสร้าง (SHOP DRAWING) และแบบที่สร้างจริง (AS-BUILT DRAWING) ซึ่งเป็นแบบเพิ่มเติมที่ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ วินิจฉัยเพิ่มเติมจากแบบรายการที่ใช้เป็นคู่สัญญา เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความมั่นคงแข็งแรง ความสวยงามและความเหมาะสมอื่น ตามเจตนารมณ์ของสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ จัดทำรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นไม่ถือว่าเป็นการเพิ่มลดเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ปริมาณงานก่อสร้างแต่อย่าง ใดทั้งสิ้น แต่เป็นการกำหนดรายละเอียดให้งานก่อสร้างสมบูรณ์ทั้งนี้ ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มลดเนื่องจาก หรือคุณภาพของวัสดุต่ำกว่าที่กำหนดไว้ต้องขออนุญาตแก้ไขตามระเบียบของทางราชการและต้องได้รับอนุมัติ ก่อนถึงจะดำเนินการต่อไปได้

ตรวจแล้ว

นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ

เจ้าพนักงานวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายงานเขตก่อสร้าง

3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ในแบบและรายการก่อสร้างนี้ได้มี “ประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หรือได้รับ “การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม” แล้วให้ยกเลิก รายการวัสดุและอุปกรณ์นั้น และให้ใช้ตามรายการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือรายการผลิตภัณฑ์ที่ ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ให้ถือรายการที่กำหนดในบัญชีคู่มือผู้ซื้อและใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นถึงเดือนที่จะประกาศแจ้งความขายแบบ

4 การทดสอบหรือตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง

โดยผู้ว่าจ้างหรือผู้ให้บริการนั้น ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องค่าบริการ

ลงที่ 14/2561 วันที่ ๑๓ มิ.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

นายสุวิทย์ อ.สุวรรณ

SUTERACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

รายละเอียดรายการทั่วไป

1 ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าโรงงานชั่วคราว หรือวัสดุก่อสร้างหรือการจดทะเบียนผู้รับจ้างจะไม่กระทำ กีดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะที่ผ่านไปมา และเมื่อเลิกงานแล้วผู้รับจ้างจะต้องเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ อุปกรณ์การก่อสร้างไว้ภายในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น

2 ระหว่างการก่อสร้างนั้นยังไม่ปิดถนน ตรอก ซอย ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องทำการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรอก ซอยในบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเดิม

3 ผู้รับจ้างจะต้องหาทางป้องกันมิให้ดินทราย หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ตกลงในบ่อหรือท่อระบายน้ำ เป็นอันตราย และถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการตักวัสดุดังกล่าวขึ้นจากบ่อ พัก หรือท่อระบายน้ำให้หมดสิ้นโดยไม่ชักช้า

ตรวจแล้ว

4 การขุดร่อนดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจทำให้น้ำหรือดินปนเปื้อนที่ขุดนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ จัดทำกำแพงกันดินชั่วคราว เพื่อป้องกันการทรุดและดินที่ขุดขึ้นมาต้องไม่กองรั้วถ้ามีไว้ในกรณีที่มี สถานที่กอง ให้ผู้รับจ้างบริหารจัดการขนย้ายไปทันที

5 การขุดร่อนดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ผู้รับจ้างต้องขุดเป็นระยะทางยาวพอสมควรให้สัมพันธ์กับการ ดำเนินการขั้นต่อไป ห้ามผู้รับจ้างขุดร่อนดินยาวเกินความจำเป็น และการขุดผ่านทางแยกหรือทางเข้าบ้าน ผู้รับจ้างต้องจัดหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุอื่นใดปูรองที่ขุดให้ยวดยานผ่านได้ หากผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาแผ่นเหล็ก หรือวัสดุใดมาปูได้ภายใน 6 ชั่วโมง นับแต่เริ่มขุดและไม่มีการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการ กลบหลุมร่อนดินนั้นเสียก่อน สำหรับท่อที่นำมาใช้ผู้รับจ้างวางเรียงให้ได้แนวไม่เกะกะกีดขวางการสัญจรของ ประชาชนและยวดยานพาหนะ

6 ในกรณีที่ต้องต่อท่อระบายน้ำจากอาคารของประชาชนเชื่อมกับท่อระบายน้ำที่สร้างใหม่ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำให้เรียบร้อย และต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่เจ้าของอาคารในการระบายน้ำประจำวันด้วย

7 การซ่อมบูรณะทางเท้าเดิมที่ชำรุด เศษวัสดุที่รื้อถอนออก ห้ามผู้รับจ้างกองไว้เป็นการกีดขวาง การสัญจร หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ผู้รับจ้างต้องจัดการขนย้ายไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างทันที สำหรับวัสดุ ก่อสร้างบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ทราย ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้อาศัยวางบนทางเท้าได้ แต่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ คอกใส่โดยไม่กีดขวางการสัญจรไปมา

8 โรงงานชั่วคราวและเศษวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องรื้อถอนขนย้ายให้หมด สิ้นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน หรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว หากผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้สิทธิผู้ว่าจ้างที่ จะรื้อถอนขนย้ายเอง โดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการเข้าดำเนินการจากผู้รับจ้างได้ทั้งสิ้น

รายการสัญญา

เลขที่ 14/2561 วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ทำเนียบส่วนจำกัด ส.วีระชัยก่อสร้าง
S VEERACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

..../5..

กำหนดทำงานแล้วเสร็จ

รายการงานปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ตามแบบและรายการ เลขที่ 7/2561 กำหนดทำงานแล้วเสร็จ 60 วัน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)
ผู้รับจ้าง
Svc หจก.วีระชัยก่อสร้าง ส.วีระชัยก่อสร้าง
S.VEERACHAI CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน


(ลงชื่อ) พยานและผู้พิมพ์

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร



ตรวจแล้ว
นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ
เจ้าพนักงานช่างเขียนแบบ
เจ้าพนักงานช่างเขียนแบบ

ผู้กำหนดรายการ


หัวหน้ากลุ่มงานโครงการฯ



สํานักงานเขตคลองสาน
สำรวจและเขียนแบบ
สถาปนิก
วิศวกร
วิชาที่สำรวจ
หัวหน้างานโครงการ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
แบบแสดง
ผังบริเวณโรงเรียนวัดทองนพคุณ
สถานที่
โรงเรียนวัดทองนพคุณ
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
มาตราส่วน
แบบเลขที่ ขคส 7/2561
แผ่นที่ 1 รวม 3 แผ่น

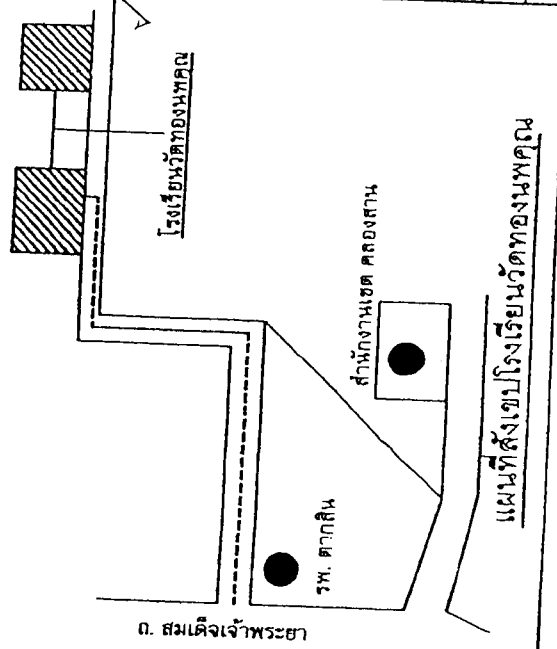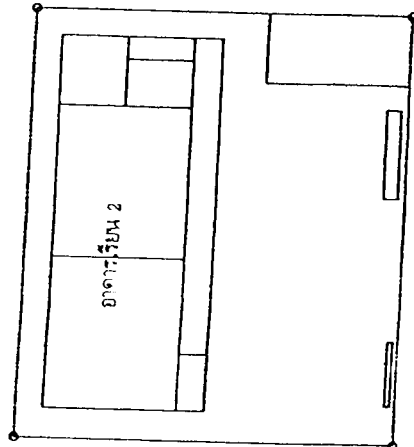

คลองวัดทองนพคุณ

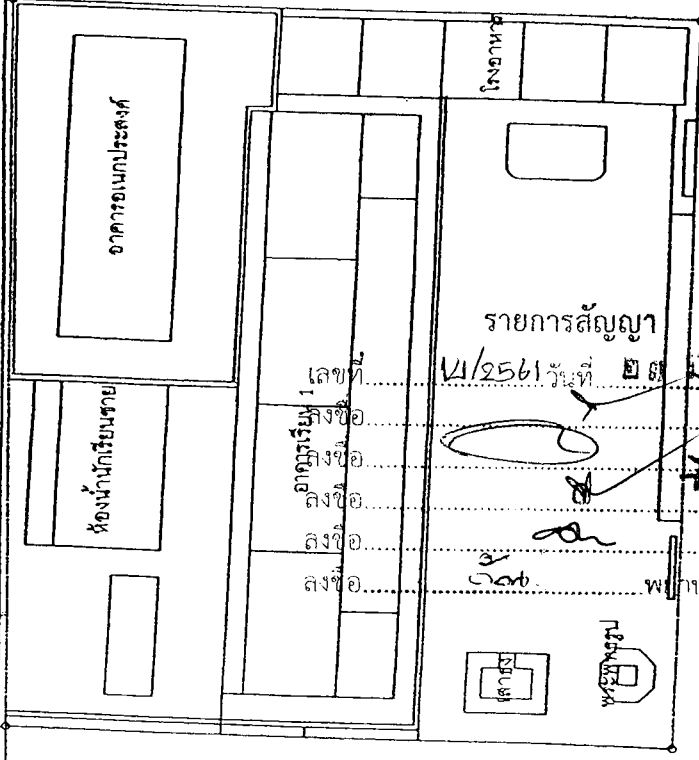

วัดทองนพคุณ

ตรวจสอบแล้ว

นายศิริพงษ์ เกษมทรัพย์
ผู้อำนวยการเขตฯ

นายศิริพงษ์ เกษมทรัพย์
ผู้อำนวยการเขตฯ

นายศิริพงษ์ เกษมทรัพย์
ผู้อำนวยการเขตฯ

นายศิริพงษ์ เกษมทรัพย์
ผู้อำนวยการเขตฯ

นายศิริพงษ์ เกษมทรัพย์
ผู้อำนวยการเขตฯ

นายศิริพงษ์ เกษมทรัพย์
ผู้อำนวยการเขตฯ


นายศิริพงษ์ เกษมทรัพย์
ผู้อำนวยการเขตฯ

นายศิริพงษ์ เกษมทรัพย์
ผู้อำนวยการเขตฯ




สำนักงานเขตคลองสาน
สำรวจและเขียนแบบ
สถาปนิก
วิศวกร
รักษาที่สาธารณะ
หัวหน้างานโครงการ ฯ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฯ
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
แบบแสดง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ
สถานที่
โรงเรียนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
มาตราส่วน
แบบเลขที่ ขดส.7-1 / 2551
แผ่นที่ 2 รวม 3 แผ่น

1. ปรับปรุงอาคารเรียน 1
- รื้อพร้อมติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กบริเวณคานคองกรีตหน้าไม้เนื้อกว้าง 0.5 มม. ที่พื้นที่ประมาณ 137 ตารางเมตร
 - รื้อพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็งวางบนโครงไม้เนื้อแข็งห้องคอมพิวเตอร์ ที่พื้นที่ประมาณ 22 ตารางเมตร
 - รื้อพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดวางเรียบ ทนไฟ 9 มม. โครงสร้างเหล็กมุมฉาก 50 มม. ห้องคอมพิวเตอร์ ที่พื้นที่ประมาณ 70 ตารางเมตร



- รื้อพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็งวางบนโครงไม้เนื้อแข็งห้องคอมพิวเตอร์ ที่พื้นที่ประมาณ 22 ตารางเมตร
- รื้อพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดวางเรียบ ทนไฟ 9 มม. โครงสร้างเหล็กมุมฉาก 50 มม. ห้องคอมพิวเตอร์ ที่พื้นที่ประมาณ 70 ตารางเมตร




14/2561 วันที่ 14/2561

นายการดี บุญ...
 (Signature)
 14/2561 วันที่ 14/2561

นายการดี บุญ...
 (Signature)
 14/2561 วันที่ 14/2561

นายการดี บุญ...
 (Signature)
 14/2561 วันที่ 14/2561

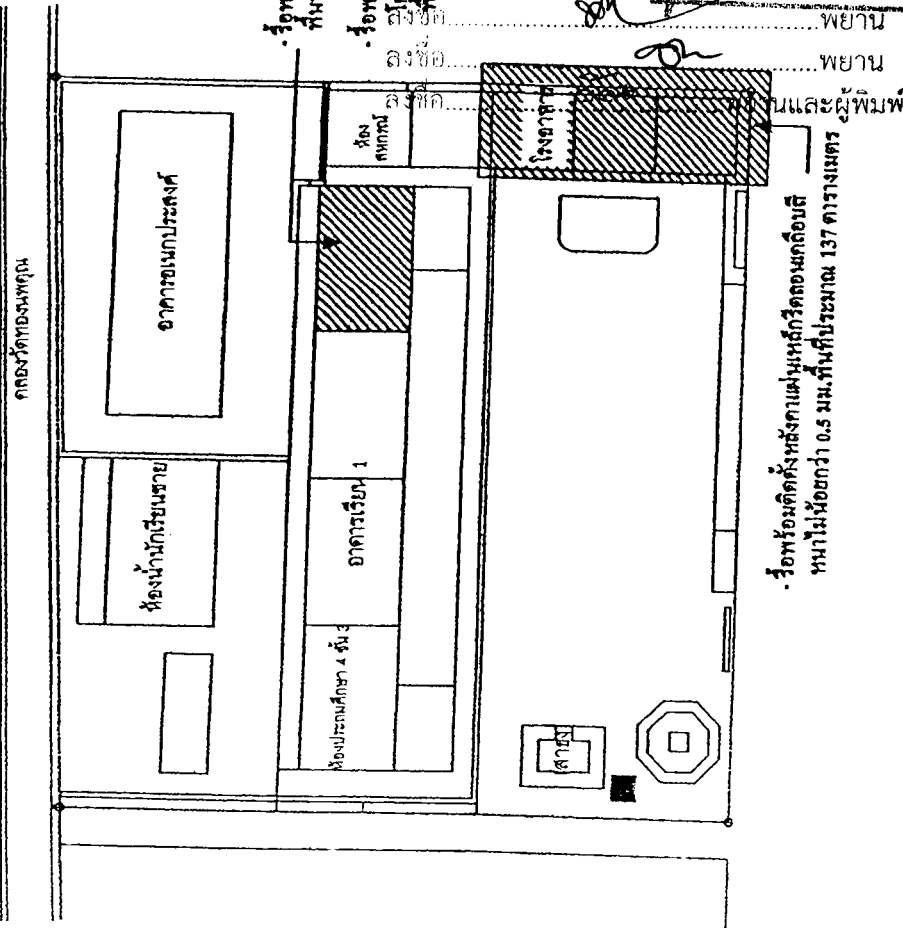

รื้อพร้อมติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กบริเวณคานคองกรีตหน้าไม้เนื้อกว้าง 0.5 มม. ที่พื้นที่ประมาณ 137 ตารางเมตร

ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ตามแบบ ขดส. 10/2558




สำนักงานเขตคลองสาน
สำรวจและเขียนแบบ
สถาปนิก
วิศวกร
รักษาที่อาคาร
หัวหน้างานโครงการ
หัวหน้าฝ่ายโยธา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน
แบบแสดง
ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ
สถานที่
โรงเรียนวัดทองนพคุณ
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
มาตราส่วน
แบบเลขที่ ๑๕.๗-๑/๒๕๕๑
แผ่นที่ 3
รวม 3 แผ่น



2. ปรับปรุงอาคารเรียน 2

- รื้อพร้อมติดตั้งหลังคากระเบื้องพื้นที่ประมาณ 2 ตร.ม.
- รื้อพร้อมติดตั้งฝ้าโอปชั่นบอร์ดลายเรียบ พื้น 9 มม. พื้นที่ประมาณ 2 ตร.ม.
- ทาสีไม้อะคริลิก 100 % พื้นที่ประมาณ 2 ตร.ม.

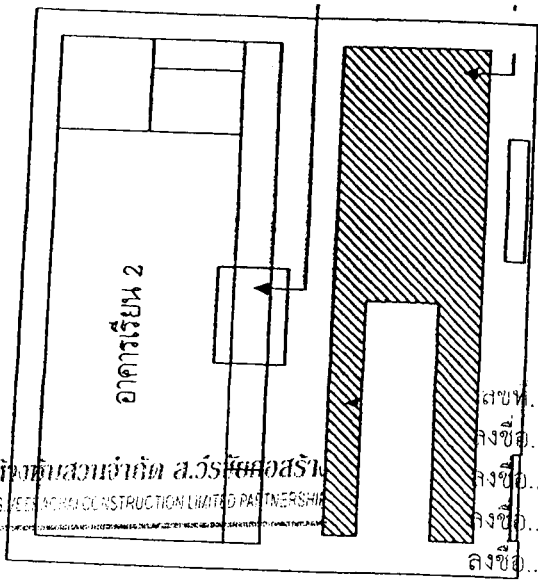

บริษัท สวีตโฮม จำกัด
SWEETHOME CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

- รื้อพร้อมติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พื้นที่มีประมาณ 55 ตารางเมตร
- ตั้รูพื้น EPDM พร้อมทำพื้น ก.ส.ถ. หนา 0.10 ซม. พื้นที่มีประมาณ 76 ตารางเมตร

ตรวจแล้ว

(นายศิริชัย) ...
ตำแหน่ง ...
วันที่ ...

ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ

รายการสัญญา

14/2561

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑

ลงชื่อ ผู้ว่าฯ
ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ พยาน
ลงชื่อ พยาน
ลงชื่อ พยานและผู้พิมพ์

